



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2012 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2013-Bartın  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

# İÇİNDEKİLER

## Yönetici Özeti

<b>1. Genel Değerlendirme</b>	<b>1</b>
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	1
1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	3
1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
<b>2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>5</b>
2.1 Devam Eden Projeler	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	5
1. 2012H030320 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	5
2. 2012H030330 Muhtelif İşler Projesi	5
3. 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	11
4. 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	12
5. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	12
6. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	12
7. 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	14
<b>3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler</b>	<b>14</b>
<b>4. 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (Eğitim)</b>	<b>15</b>
<b>5. 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (DKH Sosyal)</b>	<b>16</b>
<b>6. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>17</b>



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu konuda çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup bu raporlardan birisi de 5018 sayılı Kanununun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken “Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ’dur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Bartın İli Ağdacı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 87.520,00 m<sup>2</sup>lik arazi üzerinde yer almakta olup 7 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ile 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 dairesel lojman, pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 35.692 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>’dir.

Bartın Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyeleri sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversiteleriyle uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı tamamlandığında hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelecek olup nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye’nin daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalarına devam edecektir.

Bu kapsamda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen yatırım ödeneği ile 2011 yılında yapımına başlanılan 1.696 m<sup>2</sup>lik merkezi araştırma laboratuvarı yapım işinin 01.03.2013 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılacaktır.

Yeni kampüs alanı olarak belirlenen sahamızda ihtiyaçlarımız doğrultusunda servis yollarımız açılmış olup, servis yolları da dahil kampüsün ana hatlardaki yollarının altyapı (yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve galeri sistemi) yapım işi 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilecektir. 2012 yılında yapımına başlanılan 7.652 m<sup>2</sup>lik sayısal merkezi derslik binası 2013 yılında bitirilecektir.

Ayrıca yeni kampüs alanında birinci etap olarak yapılacak sözel derslik, Mühendislik Fakültesi idari binası, Edebiyat Fakültesi idari binası, genel yemekhane binaları ihalesi TOKİ tarafından 2013 Ocak ayında yapılmış olup yapım işine başlanacaktır.

Diğer taraftan, büyük onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemiz merkez kampüsünün Rektörlük binası önündeki istinat duvarı, eğitim binaları ve ısı merkezi onarım ve tadilatı, prefabrik derslik yapımı, trafo tesisatı, turnike yeri sundurma yapımı, Edebiyat ve Eğitim Fakültesi çatı onarımı, aydınlatma direklerinin elektrik tesisatı yenileme ve aydınlatma işi, Rektörlük makamı ve Rektörlük katı bakım onarımı ile peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ile 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz “2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN  
Rektör

**1. GENEL DEĞERLENDİRME****1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan üniversitemizin 2012 mali yılı yatırım projeleri (kamulaştırma dahil) için ayrılan 22.221.200 ₺ tutarındaki ödeneğin 17.200.000 ₺ hazine yardımı, 4.146.200 ₺ net finansman ve 875.000 ₺ yedek ödenekten oluşmaktadır.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yedek Ödenek	Toplam
2012H030320	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	-	-	100.000
2012H030330	Muhtelif İşler	2.500.000	4.045.000	875.000	7.420.000
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	1.200.000	-	-	1.200.000
2010K120590	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000	-	-	2.000.000
2009H030440	Kampüs Altyapısı	2.500.000	-	-	2.500.000
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	7.398.000	-	-	7.398.000
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000	-	-	1.500.000
	Kamulaştırma	2.000	101.200		103.200
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>17.200.000</b>	<b>4.146.200</b>	<b>875.000</b>	<b>22.221.200</b>

**2012 Yılı Yatırımların Finansman Kaynakları****1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi**

2011-2012 eğitim öğretim döneminde 7.322 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 338 akademik 202 idari olmak üzere toplam 540 personel ile hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Merkez kampüse ilaveten, Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesindeki 3.102 m<sup>2</sup>'lik alanda, Kurucaşile İlçesinde 350 m<sup>2</sup>'lik alanda ve Ulus İlçesinde mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 300 m<sup>2</sup> 'lik kısmında faaliyetine devam etmektedir.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 dairesel lojman (kampüs dışında 8 dairesel lojman), pis su arıtma tesisi ve

## BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 35.692 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ FİZİKİ ALANLAR		m <sup>2</sup>
Açık Spor Alanları Toplamı		9.818
Kapalı Alanlar Toplamı		35.692
Rektörlük Binası		1.555
Orman Fakültesi		11.400
Mühendislik Fakültesi		1.865
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		1.865
Edebiyat-Eğitim-Fen Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		5.185
Kütüphane Binası		3.235
Prefabrik Laboratuvar Binası		120
Prefabrik Derslik Binası		1.510
Lojmanlar (32 Daire)		3.328
Yemekhane Binası		1.725
Atölye ve Marangozhane		550
Seralar		1.254
Kapalı Spor Salonu		1.200
Ana Kapı Danışma Binası		95
Atıksu Arıtma Tesisi		430
Isı Merkezi		290
Trafo ve Jeneratör Binası		85
<b>TOPLAM FİZİKİ ALAN</b>		<b>45.510</b>

Üniversitemiz Fiziki Alanları

Alan	Sayı	Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasitesi
Kantin	4	770	950
Öğrenci ve Personel Yemekhaneleri	3	1.725	1.450
Kapalı Spor Tesisi	1	1.200	875
Açık Spor Tesisi	1	580	350
Fitness Salonu	1	50	18
Akademik Personel Çalışma Odası	145	3.620	342
İdari Personel Çalışma Odası	79	2.040	212
<b>TOPLAM SOSYAL ALAN</b>	<b>234</b>	<b>9.985</b>	-

Üniversitemiz Sosyal Alanları

## BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Alan	Kapasite 0-25	Kapasite 26-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 200 -üzeri
Anfi	-	-	-	-	10	-
Sınıf	-	23	11	13	-	-
Bilgisayar Lab.	1	2	2	-	-	-
Diğer Lab.	16	2	-	-	-	-
Atölyeler	6	1	5	2	-	-
Teknoloji Sınıfı	1	1	-	-	-	-
Proje Çizim Salonu	3	-	-	-	-	-
Toplantı Salonu	-	5	-	-	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	-	1
Okuma Salonu	-	-	-	-	1	-
<b>TOPLAM</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

### Üniversitemiz Eğitim Alanları

#### 1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı /Kalite Artışı /İyileşme

Üniversitemizde 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında açılan yeni fakülte ve enstitü ile birlikte öğrenci sayısı hızla artmıştır. Mevcut kampüs içerisinde yer alan binaların ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle Bartın Meslek Yüksekokulu, Karaköy Mahallesi Türbe Yanı Mevkiinde üniversitemize tahsis edilen 3.102 m<sup>2</sup>'lik lise binasına taşınmıştır.

Meslek Yüksekokulumuzun Yat İşletme ve Yönetimi ile Gemi İnşaatı programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan binanın 350 m<sup>2</sup>'lik kısmında, Tekstil Teknolojisi ile Ormancılık ve Orman Ürünleri programları ise Ulus İlçesinde mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 300 m<sup>2</sup>'lik kısmında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Yeni kurulan fakülte ve enstitü ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı artmıştır. Yeni kampüs alanında yapılacak olan derslik ve idari binalar için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 12.03.2012 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu süreç içerisinde derslik ihtiyacını karşılamak üzere 1.510 m<sup>2</sup>'lik prefabrik derslik binası yapılmış olup 605 m<sup>2</sup>'lik prefabrik derslik yapımı ise tamamlanmak üzeredir.

## 1.4. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 17.198.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaç gereği 4.146.200 ₺ likit karşılığı ödenek ve 875.000 ₺ yedek ödenek eklenmiştir.Yılsonunda toplam 22.118.000 ₺ ödeneğin 10.439.021 ₺ harcanmıştır. Toplam ödeneğe göre % 47 nakdi gerçekleşme oranı saptanmıştır.

Proje Adı	2012 Başlangıç Ödeneği	Revize	Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>	<b>15.198.000</b>	<b>20.118.000</b>	<b>9.172.175</b>	<b>45</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	-	-
Muhtelif İşler Projesi	2.500.000	7.420.000	5.513.600	74
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.200.000	1.200.000	12.764	1
Kampüs Altyapısı	2.500.000	2.500.000	-	-
Derslik ve Merkezi Birimler	7.398.000	7.398.000	3.645.811	49
Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000	1.500.000	-	-
<b>DKH SEKTÖRÜ</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.266.846</b>	<b>63</b>
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000	2.000.000	1.266.846	63
<b>TOPLAM</b>	<b>17.198.000</b>	<b>22.118.000</b>	<b>10.439.021</b>	<b>-</b>

## Sektörel Bazda Harcama Oranı

Proje başlangıç ödeneklerinde meydana gelen nakdi revizeler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bununla beraber 2009H030450 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Kalkınma Bakanlığının da onayıyla aşağıdaki revize işlemi gerçekleştirilmiştir.

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK		PROJE TUTARI		2012 YILI YATIRIMI	
		2012 Yılı Programı	2012 Yılı Revize Programı	2012 Yılı Programı	2012 Yılı Revize Programı	2012 Yılı Programı	2012 Yılı Revize Programı
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	İnş.+Don. Merkezi Derslik(7652 m2)	İnş.+Don. TOKİ Prt.1.Etap (39884m2) Pref.Ders.Bin.(2030m2)	10.000	51.000	7.398	7.398 20.100 *

\*6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 2012 yılına devreden likit karşılığı ödenekten karşılanacak olup TOKİ Protokolü 1. Etap (39884m2) yapım işi için kullanılacaktır.



## 2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

##### 1. 2012H030320 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2012 mali yılında 100.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden harcama yapılmamıştır.

##### 2. 2012H030330 Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2012 mali yılında 2.500.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 4.045.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken projeye yedek ödenekten 875.000 ₺ aktarılmıştır. Yıl sonunda toplam 7.420.000 ₺ tutarında ödeneğin 5.513.600 ₺ harcanmıştır. Projeden yapılan harcamalar aşağıda ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

Tertip	Gider Türü	Harcama
06.1.1.01	Büro Mefruşatı Alımları	247.730,11
06.1.1.03	Okul Mefruşatı Alımları	150.219,69
06.1.1.04	Hastane Mefruşatı Alımları	5.274,60
06.1.1.05	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	11.728,36
06.1.2.01	Büro Makinaları Alımları	146.634,00
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	196.878,98
06.1.2.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	2.453.047,09
06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.019.167,20
06.1.2.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	215.577,22
06.1.3.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	5.377,26
06.1.4.01	Kara Taşıtı Alımları	75.232,80
06.1.6.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	118.171,13
06.1.6.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	191.097,26

Tertip	Gider Türü	Harcama
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	97.851,17
06.7.1.01	Proje Giderleri	382.103,99
06.7.1.02	Müşavirlik Giderleri	197.508,72
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.513.599,58</b>

Muhtelif İşler Projesi Harcama Kalemleri

**Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımı**

Projeden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına 1.700.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Bir fakülte ve bir enstitünün açılması sonucu beraber ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 3.950.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 5.650.000 ₺ ödeneğin 4.624.718 ₺ harcanmıştır. Laboratuvar cihazları alımı için Devlet Malzeme Ofisine krediler açılmış ancak DMO'nun ihalede bazı kalemlere teklife çıkmaması ve bazı kalemlerde de yaklaşık maliyetin çok üstünde teklife çıkması nedeniyle iptal edilen alımlara rağmen toplam ödeneğe göre gerçekleştirme oranı % 82 düzeyinde olmuştur.

**Yayın Alımı Giderleri**

Projeden Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 300.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş, öğrenci sayısının hızla artması ve farklı branşlarda yeni bölümlerin açılmasıyla ortaya çıkan kitap ihtiyacı karşısında yetersiz kalan ödeneğe 15.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 315.000 ₺ ödeneğin 309.268 ₺ harcanmıştır.

Yayın Alımı	(₺)
Veri Tabanı Aboneliği	118.153
Kitap Alımı	115.812
E-Kitap Alımı	75.303
<b>TOPLAM</b>	<b>309.268</b>

*Yayın Alımı Harcamaları*

Kütüphane Kaynakları	
Kitap	23.082
Sürelî Yayın	296
Elektronik Kitap	850
Tez	1.138
Kitap Dışı Materyal	1.250

### **Büyük Onarım Giderleri**

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos ayında ilimizde meydana gelen fırtına sonucu oluşan hasarın telafisi için Kalkınma Bakanlığı onayıyla projeye yedek ödenekten 875.000 ₺ aktarılmıştır. Ayrıca ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 80.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 1.455.000 ₺ ödeneğin 579.613 ₺ harcanmıştır.

Mevcut kampüs alanı içerisinde ve kampüs dışında üniversitemiz Meslek Yüksekokuluna tahsis edilen 3.102 m<sup>2</sup> 'lik lise binasında iç ve dış bakım onarımı yapılmıştır. Kampüs çevresinde bulunan ve yıkılarak güvenliği tehlikeye düşüren tel örgüler yenilenmiştir. Kampüs içerisinde ve futbol sahasındaki beton tribünlere emprenye ahşap oturak yapılmıştır. Üniversiteye girişteki turnikeleri yağmurdan ve güneşten korumak amacıyla üzerlerine sundurma yapılmıştır.



Kampüs İçi Bakım Onarım



Eğitim Binaları Onarım İşi

Bartın Üniversitesi eğitim binaları ve ısı merkezinde yapılacak olan onarım ve tadilat işi ihalesi kapsamında bay ve bayan olmak üzere on adet tuvalette yer ve duvar seramikleri sökülerek yerine yeni yer ve duvar seramiği yapılmıştır. Seramik haricinde kalan duvar ve tavan plastik boya ile boyanmıştır.

Yine Bartın Üniversitesi eğitim binaları ve ısı merkezinde yapılacak olan onarım ve tadilat işi ihalesi kapsamında Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak kullanılacak olan Eski Cumhuriyet Lisesinde derslik, akademik ve idari personel odası olarak kullanılacak bölümlerde plastik ve yağlı boya yapılması alçıpan bölme söküm, alçıpan duvar yapım, alçı sıva işleri, parke işleri, bilgisayar laboratuvarında yüksek döşeme işleri, kırık pencere camlarının değiştirilmesi eksik pencere kollarının tamamlanması işleri yapılmıştır. Ayrıca Bartın İli genelinde 12.08.2012 tarihinde çıkan fırtınadan dolayı üniversitemizin Ağdacı Kampüsünde hasar gören çatılar yeniden yapılmıştır.




Fırtına Sonucu Oluşan Hasar



Eğitim Binaları Onarım İşi

Yıkılan Rektörlük önü istinat duvarı ihale edilerek yapılmıştır. Ayrıca rektörlük önünde yapılan peyzaj çalışması ve ön cephe aydınlatma işi yapılmıştır.

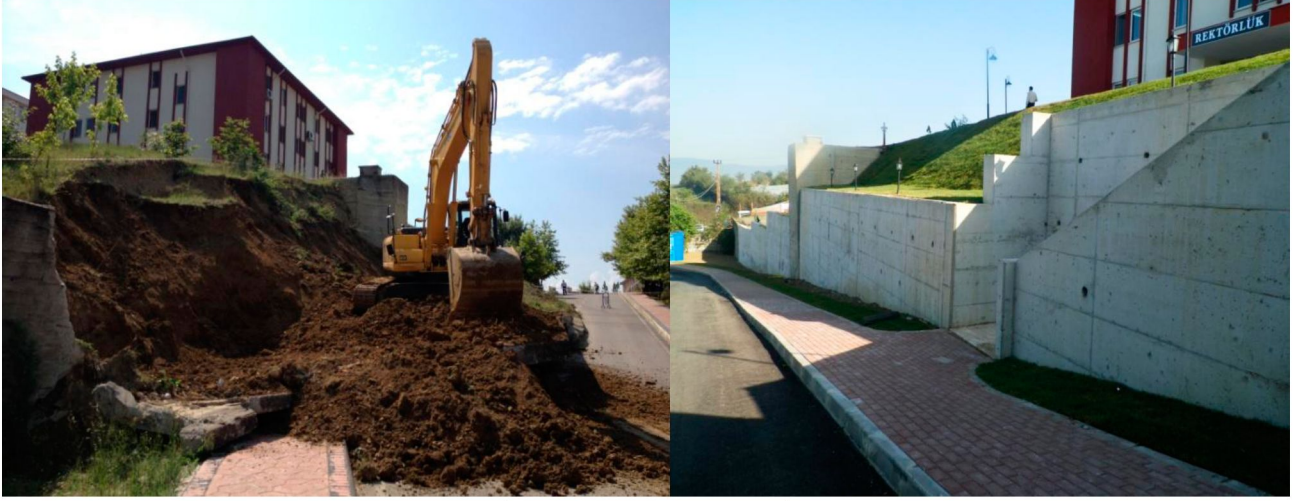

**İstinat Duvarı Yapım İşi**



**Rektörlük Önü Peyzaj Çalışması ve Aydınlatma İşi**

Mevcut Kampüs alanında bulunan arıtma tesisinin işlevini kaybetmesinden dolayı meydana gelen kirliliği gidermek amacıyla Bartın Üniversitesi Betonarme Tip Atık Su Arıtma Tesisat Tadilat İşi 19.04.2012 tarihinde ihaleye çıkılmış olup 27.08.2012 tarihinde tamamlanmıştır.



Atık Su Arıtma Tesisat Tadilat İşi

### 3. 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2012 mali yılında 1.200.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden, spor salonu soyunma odaları ve fitness statik projelendirme işi ve kampüs emprenye tribün yapım işi için 12.764,53 ₺ harcanmıştır.



Emprenye Tribün Yapım İşi

#### 4. 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2012 mali yılında 2.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir.Yıl sonunda toplam 1.266.846,07 ₺ tutarında ödenek Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım işi için harcanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarının yapım işi 14.04.2011 tarihinde ihale edilmiş olup iş 01.03.2013 tarihi itibarıyla kabulü yapılacaktır. Merkezi araştırma laboratuvarı 271,91 m<sup>2</sup> idari bina, 712,48 m<sup>2</sup> çevre gıda laboratuvarı, 712,48 m<sup>2</sup> ise mekanik laboratuvarı olmak üzere 1.696,87 m<sup>2</sup>'lik alandan oluşmaktadır.



Merkezi Araştırma Laboratuvarının Yapım İşİ

#### 5. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2012 mali yılında 2.500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden harcama yapılmamıştır.

#### 6. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2012 mali yılında 7.398.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir.Yıl sonunda toplam ödeneğin 3.645.812 ₺ Prefabrik Derslik ve Ofis Binası Yapım İşi için harcanmıştır.

Yeni kurulan fakülte ve bölümlerle orantılı olarak hızla artan öğrenci ve personel sayısı beraberinde derslik, laboratuvar, atölye gibi ihtiyaçları doğurmaktadır. Bundan dolayı mevcut kampüs alanına 1.510 m<sup>2</sup> prefabrik derslik ve ofis binası yapımı 17.04.2012 tarihinde ihale edilerek



## BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

tamamlanmıştır. Ayrıca 605 m<sup>2</sup>'lik Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi 23.08.2012 tarihi ile ihale edilmiş olup iş devam etmektedir.

Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi elektrik, mekanik, mimari, statik ve jeolojik etüd işi ihale edilmiştir. Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi 22.03.2012 tarihinde ihale edilmiş olup iş bitim tarihi 20.08.2013 tür. Merkezi derslik binası 7.652 m<sup>2</sup>, trafo binası 280 m<sup>2</sup> ve 220 m<sup>2</sup>'lik elektrik dağıtım merkezi olmak üzere toplam 8.152 m<sup>2</sup>'lik alandan oluşmaktadır.



Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi



Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi

**7. 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi**

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2012 mali yılında 1.500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden harcama yapılmamıştır.

**3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER**

✓ Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.

✓ İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

## 2012 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Sektör Adı** : Eğitim

2012 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
41923	404	2012H030320	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2012	Bartın		100	-			100					0
41927	404	2009H030440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2014	Bartın		10.000	-			2.500					0
43386	404	2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	Bartın		51.000	-			7.398					3.646
41931	404	2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2014	Bartın		5.000	-			1.500					0
41933	404	2012H030330	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	Bartın		2.500	-			2.500	+	4.920			5.514
41129	404	2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014	Bartın		3.500	540			1.200					13
<b>TOPLAM</b>								<b>72.100</b>	<b>540</b>			<b>15.198</b>					<b>9.173</b>

## 2012 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Sektör Adı** : DKH Sosyal

2012 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42768	404	2010K120590	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2013	Bartın		4.280	228			2.000					1.267
<b>TOPLAM</b>								<b>4.280</b>	<b>228</b>			<b>2.000</b>					<b>1.267</b>

## 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	72.100	-	-	540	-	-	15.198	-	-	20.118	-	-	9.173
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	-	4.280	-	-	228	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	1.267
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	1	-	4.280	-	-	228	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	1.267
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>76.380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.440</b>

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100



+90 378 223 50 00



+90 378 223 50 21



<http://www.bartın.edu.tr>
