



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2014 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2015-Bartın  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

# İÇİNDEKİLER

## *Yönetici Özeti*

<b>1. Genel Değerlendirme</b>	<b>1</b>
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	2
1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	4
1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
<b>2. 2014 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>5</b>
2.1 Devam Eden Projeler	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	5
a) 2014H032340 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	5
b) 2014H032350 Muhtelif İşler Projesi	6
c) 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	11
d) 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	11
e) 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	12
f) 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	13
g) Kamulaştırma Giderleri	14
<b>3. 2014 Yılı Yatırım Projeleri Listesi</b>	<b>15</b>
<b>4. 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>16</b>



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Bartın İli Ağdacı Mahallesiinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 87.520,00 m<sup>2</sup> lik arazi üzerinde yer almakta olup 7 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ile 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 dairesel lojman, pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

Bartın Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyeleri sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversiteleriyle uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı tamamlandığında hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelecek olup nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye'nin daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalarına devam edecektir.

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 13 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup> lik alan belirlenmiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014 – 2015 akademik yılında Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Yeni kampüs alanında Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi idari binası, Mühendislik Fakültesi idari binası, genel yemekhane binaları inşaatının yapımı 2015 yılında tamamlanacak olup aynı yıl binalar faaliyete geçecektir.

Ayrıca Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 2014 yılında başlanılmış olup 2016 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir.

Diğer taraftan, büyük onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemiz merkez kampüsünün muhtelif binalarının bakım onarımı ile yangın tesisatı ve elektrik ana dağıtım panosu yenileme işi, spor salonu yapım işi ile sayısal derslik panel çit yapım işi, doğalgaz iç tesisat işi, lng tankı inşaat işi, çelik korkuluk yapım işi gibi çalışmalar yapılmıştır.

Birimlerimizin yaygın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ile 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz “2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN  
Rektör

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

## 2014 YILI

### YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

#### 1. GENEL DEĞERLENDİRME

##### 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin 2014 mali yılında 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 25.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda 3.223.118,20 ₺ tutarında net finansman kullanılarak toplam ödenek 28.223.118,20 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 22.824.756,27 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli	Program Yılı Başlangıç Ödeneği
2014H032340	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50.000	50.000
2014H032350	Muhtelif İşler	3.000.000	3.000.000
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	5.120.000	3.000.000
2009H030440	Kampüs Altyapısı	6.000.000	2.500.000
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	59.500.000	14.900.000
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	5.500.000	1.500.000
Kamulaştırma		50.000	50.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>79.220.000</b>	<b>25.000.000</b>

Bu harcama içerisinde Eğitime İlişkin Araştırma – Geliştirme Hizmetleri fonksiyonunun 06.9 ekonomik koduna 23.231,20 ₺ eklenmiş ve aynı tutarda harcama gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçesinde 2014 yılında (kamulaştırma dahil) yatırım projeleri kapsamında toplam ödenek tutarı 28.199.887 ₺ olup harcama tutarı 22.801.525,07 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Kampüs Altyapısı Projesinden 1.950.000 ₺, Lojman ve Sosyal Tesis Projesinden 1.500.000 ₺, Çeşitli İşlerin Etüt Projesinden 50.000 ₺ olmak üzere toplam 3.500.000 ₺ aynı sektör içerisinde projeler arası aktarım yapılmış, ayrıca 1.025.000 ₺ revizyon ödeneği eklenmiştir. 2014 H 032 350 Muhtelif İşler Projesine ise 2.174.887 ₺ tutarında revizyon ödeneği eklenmiştir.

## 1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

2013 – 2014 eğitim öğretim döneminde 9.086 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 452 akademik, 245 idari olmak üzere toplam 697 personel ile hizmet vermektedir.



Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Ayrıca, mevcut kampüste yer alan binaların yeni açılan fakültelerden sonra ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle; daha önce kampüs içerisinde eğitim-öğretim vermekte olan Bartın Meslek Yüksek Okulu kampüs dışında temin edilen 3.102 m<sup>2</sup>'lik bir binada hizmet vermektedir.

Meslek Yüksekokulunun Yat ve İşletme Yönetimi Programı, Gemi İnşaatı Programı ile Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait binanın 350 m<sup>2</sup>'lik kısmında, Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ise Ulus ilçesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binanın 300 m<sup>2</sup>'lik kısmında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, kampüs içinde 24 dairesel lojman (kampüs dışında 8 dairesel lojman) pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.



<b>Ağdacı Kampüsü</b>	<b>87.520 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>36.297 m<sup>2</sup></b>
Rektörlük Binası	1.555 m <sup>2</sup>
Atölye ve Marangozhane	550 m <sup>2</sup>
Orman Fakültesi Binası-	11.400 m <sup>2</sup>
Edebiyat- Eğitim-Fen Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası	5.185 m <sup>2</sup>
İslami İlimler Fakültesi Binası	1.865 m <sup>2</sup>
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	1.865 m <sup>2</sup>
Prefabrik Laboratuvar Binası	120 m <sup>2</sup>
Yemekhane Binası	1.725 m <sup>2</sup>
Kütüphane Binası	3.235 m <sup>2</sup>
Lojmanlar (2*12 Daire)	3.328 m <sup>2</sup>
Ana Kapı Danışma Binası	95 m <sup>2</sup>
Seralar	1.254 m <sup>2</sup>
Trafo ve Jeneratör Binası	85 m <sup>2</sup>
Isı Merkezi	290 m <sup>2</sup>
Atık Su Arıtma Tesisi	430 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Salonu	1.200 m <sup>2</sup>
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818 m <sup>2</sup>
Mehmet Akif Ersoy Dersliği	1.190 m <sup>2</sup>
Öğretim Üyesi Binası	320 m <sup>2</sup>
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>46.115 m<sup>2</sup></b>

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 13 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup>'lik alan belirlenmiştir. Kamulaştırmanın %98'i tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014 - 2015 akademik yılı ile birlikte Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi idari binaları ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binaları inşaatının yapımı 2015 yılında tamamlanacak olup aynı yıl binalar faaliyete geçecektir.

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 2014 yılında başlanılmış olup 2016 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

<b>Kutlubeyyazıcılar Kampüsü</b>	<b>1.162.781,55 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>9.854 m<sup>2</sup></b>
Sayısal Derslik Binası	7.652 m <sup>2</sup>
Merkezi Laboratuvar Binası	1.702 m <sup>2</sup>
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	500 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>9.854 m<sup>2</sup></b>

### 1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

### 1.4. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 25.000.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaç gereği 3.199.887 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 28.199.887 ₺ ödeneğin 22.801.525 ₺ tutarı harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %91, toplam ödeneğe göre %81 olarak tespit edilmiştir.

Proje Adı		2014 Başlangıç Ödeneği	Revize (projeler arası aktarma ve ekleme)	Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>		<b>21.950.000</b>	<b>3.199.887</b>	<b>22.801.525</b>	<b>103,9</b>
2014H032340	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50.000	-50.000	-	-
2014H032350	Muhtelif İşler	3.000.000	2.174.887	4.874.105	<b>162,5</b>
2009H030440	Kampüs Altyapısı	2.500.000	-1.950.000	539.983	<b>21,6</b>
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	14.900.000	4.525.000	17.387.437	<b>116,7</b>
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000	-1.500.000	-	-
<b>BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	3.000.000	-	-	-
<b>KAMULAŞTIRMA</b>		<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>25.000.000</b>	<b>3.199.887</b>	<b>22.801.525</b>	<b>91,2</b>



## 2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI


### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

##### a) 2014 H 032 340 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi



- Lojman Binalarına Ait Projelerin Hazırlanması İş

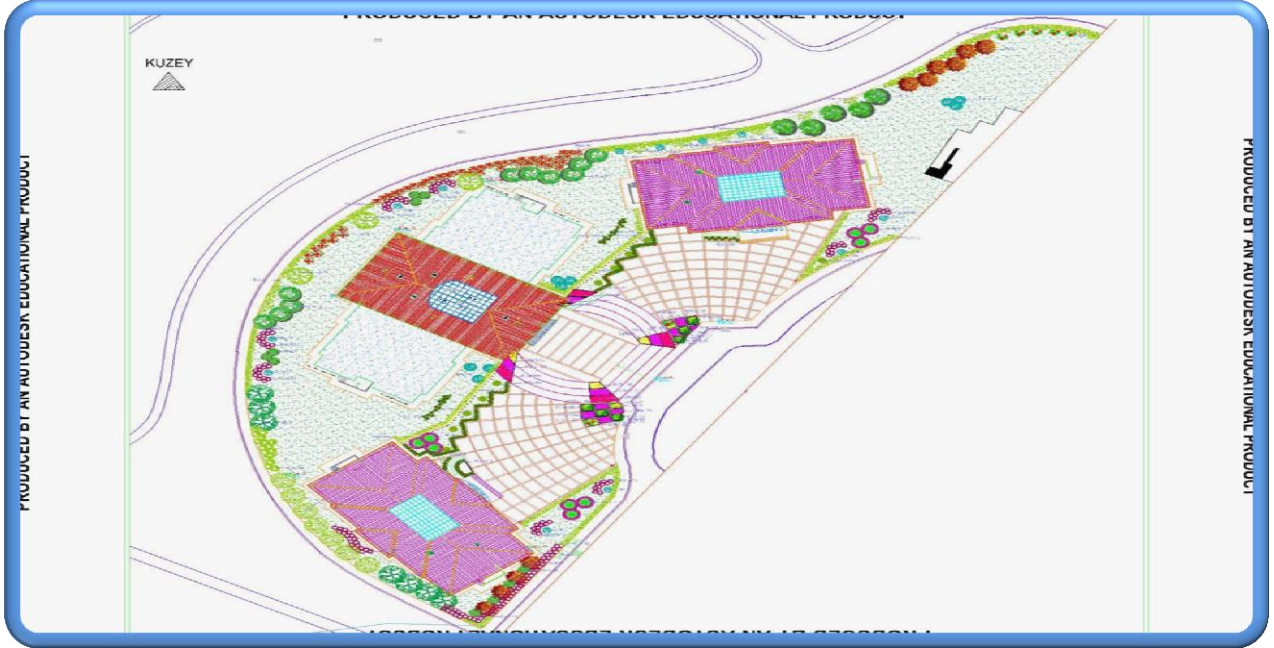

- Rektörlük Binası, İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Binaları Proje Hazırlanması İş

## b) 2014 H 032 350 Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2014 mali yılında 3.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 2.174.887 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 5.174.887 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 4.874.105,26 ₺ tutarı harcanmıştır.





Projeden yapılan harcamalar ařađıda ayrıntılarıyla gsterilmiřtir.

Tertip	Gider Tr	Harcama
06.1.1.01	Bro Mefruřatı Alımları	168.014,99
06.1.1.03	Okul Mefruřatı Alımları	271.509,03
06.1.1.04	Hastane Mefruřatı Alımları	14.723,40
06.1.1.05	Sosyal Tesis Mefruřatı Alımları	28.491,10
06.1.1.90	Diđer Mefruřatı Alımları	96.385,94
06.1.2.01	Bro Makinaları Alımları	29.849,61
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	187.598,47
06.1.2.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.870.226,87
06.1.2.05	İřyeri Makine Teçizat Alımları	136.518,12
06.1.2.90	Diđer Makine Teçizat Alımları	320.218,25
06.1.3.03	Tıbbi Gereçler Alımları	4.469,84
06.1.3.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	45.788,00
06.1.4.01	Kara Tařıtı Alımları	679.337,00
06.1.6.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	118.988,80
06.1.6.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	229.877,90
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	46.600,00
06.3.3.01	Lisans Alımları	79.827,00
06.7.1.02	Mřavirlik Giderleri	224.401,17
06.7.2.04	zel Tesisat Giderleri	14.160,00
06.7.7.01	Hizmet Binası	307.120,23
<b>Toplam</b>		<b>4.874.105,26</b>



SEM (Scanning Electron Microscopy) Cihazı





### Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımı

Projeden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına 2.150.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Dönem içerisinde ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 1.974.887 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 4.124.887 ₺ ödeneğin 3.979.557,16 ₺'si harcanmıştır. Toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 96,5 düzeyinde olmuştur.

### Yayın Alımı Giderleri

Projeden Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 350.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda ödeneğin 348.866,70 ₺'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 99,7 düzeyinde olmuştur.

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	205.299,50
Kitap Alımı	118.988,80
E-Kitap Alımı	24.578,40
<b>TOPLAM</b>	<b>348.866,70</b>



## **Büyük Onarım Giderleri**

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Dönem içerisinde ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 200.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 545.681,40 ₺ ödenek harcanmıştır

Üniversitemizde 2014 yılında gerçekleştirilen büyük onarım giderleri şöyledir:

- Meslek Yüksekokulu Elektrik Ana Panosu İmalatı Ve Kolon Kablolarının Yenilenmesi İşİ
- Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Yangın Tesisatı Ve Elektrik Ana Dağıtım Panosu Yenileme İşİ
- Alt Yapı Doğalgaz Projesi Hazırlanması İşİ
- Sayısal Derslik Panel Çit Yapım İşİ
- Sayısal Derslik Doğalgaz İç Tesisatı İşİ
- Sayısal Derslik Lng Tankı İnşaatı İşİ
- Sayısal Derslik Paslanmaz Çelik Korkuluk Yapım İşİ
- Brandalı Spor Sahası Yapım İşİ





### c) 2010 H 050 060 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje için Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2014 mali yılında 3.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ancak söz konusu proje başlatılmış olup harcama yapılmamıştır. Projenin gerçekleştirileceği alanda yer alan Elmalı Deresi'nin ıslahatı için gerekli yazışmalar yapılmıştır.



### d) 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kampüs Altyapısı Projesine 2014 yılında 2.500.000 ₺ tutarında ödenek ayrılmıştır. Kutlubey Kampüsü Temiz Su Hattı Yapım İşleri için 67.842,22 ₺ tutarında ve Kutlubey Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşleri için ise 472.140,30 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır. Toplam 539.982,52 ₺ tutarında harcama yapılan projeden Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 1.950.000 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır.



### e) 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler projesinde 2013 yılında başlayan TOKİ tarafından Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşleri devam etmektedir.

Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 14.900.000 ₺ olup bu tutara 1.025.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Ayrıca 2009 H 030 440 numaralı projeden 1.950.000 ₺, 2009 H 030 460 numaralı projeden 1.500.000 ₺, 2014 H 032 340 numaralı projeden 50.000 ₺ projeler arası aktarım yapılmıştır. Toplam ödeneği 19.425.000 ₺ olan projeden yapılan toplam harcama 17.927.419,81 ₺ tutarındadır.



Öğrenci Ve Personel Yemekhane Genel Görünüş



Mühendislik Fakültesi İdari Bina Genel Görünüş





Edebiyat Fakültesi İdari Bina Genel Görünüş



Merkezi Sözel Derslik

**f) 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi**

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2014 mali yılında 1.500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 1.500.000 ₺ tutarında aktarma yapılmıştır.

**g) Kamulařtırma Giderleri**

2014 yılında 50.000 ₺ tutarında olan kamulařtırma ödeneęinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamıřtır.

### 3. 2014 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Sektör Adı** : Eğitim

2014 Yılı Fiyatlarıyla

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2014H032340	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2014	Bartın		50.000	80.476			50.000	-	50.000			0
2014H032350	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2014	Bartın		3.000.000	3.691.147			3.000.000	+	2.174.887			4.874.105
2009H030440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2015	Bartın		6.000.000	-			2.500.000	-	1.950.000			539.983
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2015	Bartın		59.500.000	10.315.004			14.900.000	+	4.525.000			17.387.437
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2015	Bartın		1.500.000	-			1.500.000	-	1.500.000			0
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014	Bartın		5.120.000	-			3.000.000		-			0
<b>TOPLAM</b>						<b>79.220.000</b>	<b>14.086.627</b>			<b>24.950.000</b>					<b>22.801.525</b>

#### 4. 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

2014 Yılı Fiyatlarıyla

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	79.220.000	-	-	14.086.627	-	-	25.000.000	-	-	28.199.887	-	-	22.801.525
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	-	5.077.000	-	-	1.838.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	1	-	5.077.000	-	-	1.838.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>84.297.000</b>	-	-	<b>15.924.652</b>	-	-	<b>25.000.000</b>	-	-	<b>28.199.887</b>	-	-	<b>22.801.525</b>



# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

+90 378 223 54 99



+90 378 223 50 42



<http://www.bartın.edu.tr>

