



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2017-Bartın  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

# İÇİNDEKİLER

## Üst Yönetici Sunuşu

<b>1. Genel Değerlendirme</b>	<b>1</b>
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	4
1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
<b>2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>5</b>
2.1 Devam Eden Projeler	5
2.1.1 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	5
2.1.2 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	8
2.1.3 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	13
2.1.4 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	14
2.2 Tamamlanan Projeler	14
2.2.1 2016H031560 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	14
2.2.2 2016H031570 Muhtelif İşler Projesi	14
2.2.3 2016H031580 Yayın Alımı Projesi	16
2.2.4 2016H031590 Üniversite Bilgi Sistemi	17
<b>3. 2016 Yılı Yatırım Projeleri Listesi</b>	<b>19</b>
<b>4. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>20</b>



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Bartın İli Ağdacı Mahallesiinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 87.520,00 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almakta olup 7 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ile 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 daireli lojman, pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

Kutlubey Kampüs alanı olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup>'lik alan belirlenmiştir. Ancak 7.888,20 m<sup>2</sup>'si Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup Kutlubey Kampüsünün alanı 1.154.893,35 m<sup>2</sup> olarak güncellenmiştir. Kamulaştırmanın %98'i tamamlanmıştır.

Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2014-2015 akademik yılında tamamlanmıştır. Sözel Derslik Binası, Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Mühendislik Fakültesi İdari Binası, Trafo ve Dağıtım Merkezi Binası ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binaları inşaatının yapımı 2016 yılında tamamlanmış olup 2016- 2017 akademik yılında Edebiyat, Fen ve Mühendislik Fakülteleri Kutlubey Kampüsündeki binalarında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 2014 yılında başlanılmış olup 2017 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir. 2015 yılı 1 Blok 24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2017 yılında tamamlanacaktır.

Diğer taraftan, büyük onarım kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ile 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz “2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN  
Rektör

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

## 2016 YILI

### YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

#### 1. GENEL DEĞERLENDİRME

##### 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin 2016 mali yılında 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 26.850.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda 9.050.026 ₺ tutarında net finansman kullanılarak toplam ödenek 35.900.026 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 34.639.117,46 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	6.000	1.000
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	80.000	11.000
2009 H 030 460	Lojman ve Sosyal Tesis	8.000	4.000
2010 H 050 060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	12000	4.000
2016 H 031 560	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	200	200
2016 H 031 570	Muhtelif İşler	5.760	5.760
2016 H 031 580	Yayın Alımı	650	650
2016 H 031 590	Üniversite Bilgi Sistemi	240	240
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>112.850</b>	<b>26.850</b>

2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesine 2.925.415 ₺, 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 1.760.000 ₺, 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 636.000 ₺, 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesine 2.993.965 ₺, 2016 H 031 560 Çeşitli İşlerin Etüt Projesine 77.806 ₺, 2016 H 031 570 Muhtelif İşler Projesine 613.640 ₺ ve 2016 H 031 590 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 43.200 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir.

## 1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

2016 yılı içerisinde toplam 14.515 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 511 akademik, 245 idari olmak üzere toplam 756 personel ile hizmet vermektedir.



Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesi'nde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Eğitim yapıları ile birlikte mevcut kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, kampüs içinde 24 dairesel lojman (kampüs dışında 8 dairesel lojman) pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

Kampüste yer alan binaların yeni açılan fakültelerden sonra ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle; daha önce kampüs içerisinde eğitim-öğretim vermekte olan Bartın Meslek Yüksekokulu kampüs dışında, şehir merkezinde Türbe Yanı Mevki Karaköy Mahallesi'nde üniversitemize tahsis edilen 4.483 m<sup>2</sup>'lik bir binada hizmet vermektedir.

Meslek Yüksekokulumuzun Yat İşletme ve Yönetimi ile Gemi İnşaatı programları Kurucuşile ilçesinde mülkiyeti belediye ait olan binanın 1.391 m<sup>2</sup>'lik kısmında, Tekstil Teknolojisi ile Ormancılık ve Orman Ürünleri programları ise Ulus İlçesinde mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 3.187 m<sup>2</sup>'lik kısmında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.



<b>Ağdacı Kampüsü</b>	<b>87.520 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>36.268 m<sup>2</sup></b>
Ağdacı Lojmanları 2 Blok	3.348 m <sup>2</sup>
Atıksu Arıtma	283 m <sup>2</sup>
İİBF ve İslami İlimler Fakültesi Binası	3.730 m <sup>2</sup>
Jeneratör Binası	85 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Salonu	1.200 m <sup>2</sup>
BESYO Binası	5.185 m <sup>2</sup>
Kazan Dairesi	340 m <sup>2</sup>
Kütüphane Binası	3.235 m <sup>2</sup>
Mobilya Atölyesi	320 m <sup>2</sup>
Nizamiye	90 m <sup>2</sup>
Orman Fakültesi Binası	11.400 m <sup>2</sup>
Rektörlük Binası	1.555 m <sup>2</sup>
Yemekhane ve Mediko Sosyal Binası	1.725 m <sup>2</sup>
Mehmet Akif Ersoy Dersliği	1.105 m <sup>2</sup>
Mehmet Akif Ersoy Ofis Binası	302 m <sup>2</sup>
Yahya Kemal Beyathı Dersliği	605 m <sup>2</sup>
Prefabrik Laboratuvar	120 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540 m <sup>2</sup>
Seralar	1.100 m <sup>2</sup>
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>46.086 m<sup>2</sup></b>

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup>'lik alan belirlenmiştir. Ancak 7.888,20 m<sup>2</sup>'si Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup Kutlubey Kampüsünün alanı 1.154.893,35 m<sup>2</sup> olarak güncellenmiştir. Kamulaştırmanın %98'i tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014 - 2015 akademik yılı ile birlikte Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 2014 yılında başlanılmış olup 2017 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir.

1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanmış olup 2017 yılında tamamlanacaktır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

<b>Kutlubeyyazıcılar Kampüsü</b>	<b>1.154.893,35 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>50.522 m<sup>2</sup></b>
Merkezi Sayısal Derslik Binası	7.652 m <sup>2</sup>
Merkezi Sözel Derslik Binası	11.062 m <sup>2</sup>
Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası	1.702 m <sup>2</sup>
Edebiyat Fakültesi İdari Binası	9.518 m <sup>2</sup>
Mühendislik Fakültesi İdari Binası	8.245 m <sup>2</sup>
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	8.478 m <sup>2</sup>
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630 m <sup>2</sup>
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası	545 m <sup>2</sup>
Cami	2.690 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>50.522 m<sup>2</sup></b>

### **1.3. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme**

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

### **1.4. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları**

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 26.850.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaçlar gereği 9.050.026 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 35.900.026 ₺ ödeneğin 34.639.117,46 ₺ tutarı harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %129, toplam ödeneğe göre %97 olarak tespit edilmiştir.



Yatırım Projeleri		2016 Başlangıç Ödeneği	Revize (Projeler arası aktarma ve ekleme)	Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>		<b>22.850</b>	<b>6.590</b>	<b>27.684</b>	<b>121</b>
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	1.000	3.134	3.779	378
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	11.000	2.721	13.721	125
2009 H 030 460	Lojman ve Sosyal Tesis	4.000	-534	3.462	87
2016 H 031 560	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	200	78	278	139
2016 H 031 570	Muhtelif İşler	5.760	614	5.520	96
2016 H 031 580	Yayın Alımı	650	-	641	99
2016 H 031 590	Üniversite Bilgi Sistemi	240	43	283	118
<b>BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ</b>		<b>4.000</b>	<b>2.994</b>	<b>6.955</b>	<b>174</b>
2010 H 050 060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	4.000	2.994	6.955	174
<b>TOPLAM</b>		<b>26.850</b>	<b>9.050</b>	<b>34.639</b>	<b>129</b>

## 2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi

2016 Yılı Yatırım Programı ile 1.000.000 ₺ ödenek tahsis edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2.925.415 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiş, Lojman ve Sosyal Tesis Projesinden 208.781,39 ₺ tutar aktarma yapılmıştır. Toplam ödeneği 4.134.196,39 ₺'ye ulaşan projeden 3.778.586,39 ₺ tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında Kutlubey Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşleri için KDV dahil 637.722,13 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.





**Kutlubey Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşi**

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşi için KDV dahil toplam 756.217,23 ₺ ödeme yapılmıştır. 2017 yılı başında teslim alınacaktır.



**Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı**



Kutlubey Kampüsü Tel Çit Yapım İŖi için KDV dahil toplam 410.958,48 ₺ ödenmiŖtir.



**Kutlubey Kampüsü Tel Çit Yapım İŖi**



3 No'lu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İŖi iin KDV dahil toplam 3.003.887,70 ₺ odenmiŖtir.



**3 No'lu Trafo Binası**

### **2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

2016 yılı proje bedeli 11.000.000 ₺ olan bu projeye mali yıl boyunca 1.760.000 ₺ tutarında likit karŖılıđı denek eklenmiŖ, Lojman ve Sosyal Tesis Projesinden 961.184,70 ₺ tutarında aktarma yapılmıŖtır. Toplam deneđi 13.721.184,70 ₺'ye ulaŖan projede baŖlangı deneđine gre %125, toplam deneđe gre %100 oranında nakdi gerekleŖme sađlanmıŖtır.

Proje kapsamında TOKİ tarafından 2013 yılında baŖlayan Merkezi Szel Derslik, Edebiyat Fakltesi İdari Binası, Mhendislik Fakltesi İdari Binası, đrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İŖleri devam etmektedir.

Merkezi Szel Derslik, Edebiyat Fakltesi İdari Binası, Mhendislik Fakltesi İdari Binası, đrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İŖi iin TOKİ ye 5.679.529,35 ₺ avans verilmiŖ olup toplamda KDV dahil 39.921.948,41 ₺ hakediŖ denmiŖtir.



**Kutlubey Kampüsü Genel Görünüş**





**Mehmet Akif Ersoy Dersliđi (Merkezi Sözel Derslik)**



**Mimar Sinan Dersliđi (Merkezi Sayısal Derslik)**





**Edebiyat Fakültesi İdari Bina**



**Mühendislik Fakültesi İdari Bina**





### **Öğrenci ve Personel Yemekhanesi**

Daha önce 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde yapımına başlanan Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altına taşınmış olup Şehit Ömer HALİSDEMİR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adı verilmiştir.

KDV dahil toplam 19.744.495,24 ₺ tutarında hakediş ödenmiştir.



### **Şehit Ömer HALİSDEMİR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası**

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi adı altında devam etmekte olan bir diğer iş Kütüphane Binası Yapım İşidir. 22/08/2016 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanan işin sözleşme bedeli KDV dahil 16.189.600,00 ₺ olup KDV dahil 1.912.649,40 ₺ ödeme yapılmıştır.



**Kütüphane Binası Yapım İşİ**

### **2.1.3. 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi**

2016 yılı proje bedeli 4.000.000 ₺ olan bu projede 2015 yılında başlanan 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşİ devam etmektedir.

Projeye 2016 mali yılı içerisinde 636.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiş, KDV dahil toplam 3.462.235,25 ₺ harcama gerçekleşmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 961.184,70 ₺ ve Kampüs Altyapısı Projesine 208.781,39 ₺ tutarında aktarma yapılmıştır.



**Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşİ**



## 2.1.4. 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2016 yılı ödeneği 4.000.000 ₺ olan projede Şehit Ömer HALİSDEMİR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasında bulunan spor tesislerinin yapımı için 2.993.965 ₺ ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneği 6.993.965 ₺ olan proje, 6.954.895,74 ₺ harcama yapılarak Şehit Ömer HALİSDEMİR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının eğitim alanlarının yapımı için Derslik ve Merkezi Birimler Projesine devrolmuştur.

## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. 2016 H 031 560 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

2016 yılı ödeneği 200.000 ₺ olan projeye 77.806,00 ₺ tutarında ödenek eklenmiş olup 277.801,50 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Alım Türü	Tutar (₺)
Açık ve Kapalı Spor Alanlarının Proje Hazırlama İşi	131.245,50
Kütüphane Binası Projelerinin Hazırlanması İşi	108.560,00
Kutlubey Kampüsü Su Deposu ve Kampüs Giriş Kapısı Zemin Etüdü Hizmet Alım İşi	11.800,00
Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı Projelerinin Hazırlanması İşi	20.060,00
Su Deposu Statik İşi	6.136,00
<b>TOPLAM</b>	<b>277.801,50</b>

### 2.2.2. 2016 H 031 570 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2016 mali yılında 5.760.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 613.640 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 6.373.640 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 5.519.719,18 ₺ tutarı harcanmıştır.

Bu proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yapılan harcamalar şöyledir:

Alım Türü	Tutar
Microsoft Office Lisans Alımı	118.546,34
STATA İstatistik Yazılımı Alımı	3.894,00
EVIEWWS İstatistik Yazılımı Alımı	3.422,00
TÜBİTAK BİLGEM E-İmza	43.260,00
<b>TOPLAM</b>	<b>169.122,34</b>

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar alım türü olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

<b>Alım Türü</b>	<b>Adet</b>	<b>Tutar</b>
Bilgisayar Alımları	161	631.928,67
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	3.562	1.113.448,36
Büro Makine Alımları	69	88.879,73
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	385	1.214.461,75
Laboratuvar Cihazı Alımları	25	1.125.695,20
Laboratuvar Gereçleri Alımları	1	6.726,00
Tamir Bakım Aleti Alımları	139	19.684,51
Tıbbi Gereçler Alımları	30	36.329,84
<b>TOPLAM</b>	<b>4.372</b>	<b>4.237.154,06</b>

Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca proje kapsamında gerçekleştirilen büyük onarım giderleri:

<b>Alım Türü</b>	<b>Tutar (₺)</b>
Ağdacı Kampüsü Lojman Doğalgaz İşİ	187.464,16
Ağdacı Kampüsü Doğalgaz İç Tesisat	18.762,00
Ağdacı Kampüsü Doğalgaz Dönüşümü	331.269,50
Asansör Bakımı (Rektörlük Binası ve Sayısal Derslik)	43.447,60
Kutlubey Kampüsü Atıksu Arıtma Tesisi	8.791,00
Kutlubey Kampüsü Jeneratör Bakımı	17.700,00
Kutlubey Kampüsü Trafo Kontrol Testi	3.540,00
Kutlubey Kampüsü Yağmur Olukları Yapımı	5.310,00
Kutlubey Kampüsü Yürüme Yolu	20.414,00
Meslek Yüksekokulu (Ulus) Bakım Onarım	18.880,00
Meslek Yüksekokulu (Ulus) Kaplama İşİ	19.470,00
Orman Fakültesi Çatı Bakımı	116.702,00
Sera Tezgahı Yapım İşİ	16.500,00
Tadilat İşİ	305.192,52
<b>TOPLAM</b>	<b>1.113.442,78</b>

## Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2016H031570			2016H031570		
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-5 (1 adet)			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-5 (1 adet)		
<b>Fiziki Hedefi</b>	%100			%100		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2016 - 31/12/2016			01/01/2016 - 31/12/2016		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
5.760		6.374			6.374	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2016		5.520			5.520	

### 2.2.3. 2016 H 031 580 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2016 mali yılında 650.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Toplam 641.494,70 ₺ harcama yapılan projede %99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	334.047,36
Kitap Alımı	136.757,79
E-Kitap Alımı	170.689,55
<b>TOPLAM</b>	<b>641.494,70</b>




## Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016H031580			2016H031580		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2016 - 31/12/2016			01/01/2016 - 31/12/2016		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	650	650				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2016		642			642	

### 2.2.4. 2016 H 031 590 Üniversite Bilgi Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2016 yılında birçok modülüyle kullanılmaya başlanmıştır.

2016 yılı proje ödeneği 240.000 ₺ olan projeye 43.200 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve hakediş ödemeleri için KDV dahil toplam 283.200 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

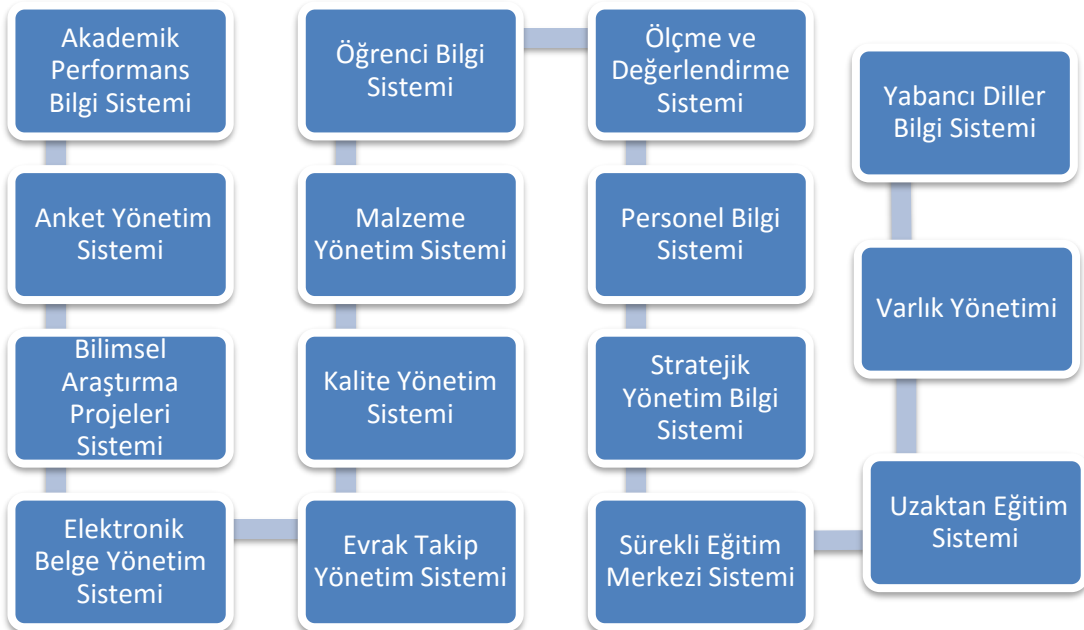

### Kullanılmakta Olan Modüller

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2016H031590			2016H031590		
<b>Proje Adı</b>	Üniversite Bilgi Sistemi			Üniversite Bilgi Sistemi		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat			Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat		
<b>Fiziki Hedefi</b>	100%			100%		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2016 - 31/12/2016			01/01/2016 - 31/12/2016		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
240		283			283	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2016		283			283	

### 3. 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Sektör Adı** : Eğitim

Bin TL, 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama*(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H0 30440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2017	Bartın		6.000	1.690			1.000	+	3.134			3.779
2009H0 30450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2017	Bartın		80.000	53.341			11.000	+	2.721			13.721
2009H0 30460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2017	Bartın		8.000	-			4.000	-	534			3.462
2010H0 50060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2017	Bartın		12.000	7.316			4.000	+	2.994			6.955
2016H0 31560	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2016	Bartın		200	-			200	+	78			278
2016H0 31570	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2016	Bartın		5.760	-			5.760	+	614			5.520
2016H0 31580	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	Bartın		650	-			650					641
2016H0 31590	Üniversite Bilgi Sistemi	Özel Bütçe	2016	Bartın		240	-			240	+	43			283
<b>TOPLAM</b>						<b>112.850</b>	<b>62.347</b>			<b>26.850</b>	<b>+</b>	<b>9.050</b>			<b>34.639</b>

\*: 2015 Kümülatif Harcama tutarı 2017 – 2019 Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan 2016 katsayısı ile deflate edilmiştir.

#### 4. 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8	-	112.850	-	-	62.347	-	-	26.850	-	-	+9.050	-	-	34.639
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>		<b>112.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+9.050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.639</b>

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

+90 378 223 54 99



+90 378 223 50 42



<http://www.bartın.edu.tr>

