



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2019-Bartın  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz merkez kampüsü Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta Ağdacı Mahallesi'nde Hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik alan üzerine kurulmuştur. Merkez kampüste İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölyeler, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitemizin fiziki kapasitesi ile birlikte personel ve öğrenci kapasitesi de hızlı bir şekilde büyümektedir. Üniversitemizin yeni kampüsü, şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Kutlubeyyazıcılar köyünde 1.090.699,72 m<sup>2</sup>'lik alan üzerine kurulmuştur. Kampüste Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Merkezi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesisler ve lojman bulunmaktadır.

Bartın Meslek Yüksekokulumuzun Gemi İnşaatı, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Marina ve Yat İşletmeciliği programları Kurucuşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 1.391 m<sup>2</sup>'lik bir binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulus ilçesindeki Ulus Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi ve Orman Ürünleri Programları ise 11 derslikli

mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait 3.187 m<sup>2</sup>'lik bir binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizde toplam 16.790 öğrenci öğrenim görmekte olup 564 akademik personel, 254 idari personel ve 130 sürekli işçi görev yapmaktadır.

Ayrıca üniversitemizde büyük onarım kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60. Maddesi, 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ile "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz "2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Orhan UZUN  
Rektör

# İÇİNDEKİLER

## Üst Yönetici Sunuşu

<b>1. Genel Değerlendirme</b>	<b>1</b>
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	6
1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
<b>2. 2018 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>7</b>
2.1. Devam Eden Projeler	7
2.1.1. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	7
2.1.2. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	7
2.2. Tamamlanan Projeler	11
2.2.1. 2018H050610 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	11
2.2.2. 2018H033210 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	12
2.2.3. 2018H033650 Muhtelif İşler Projesi	13
2.2.4. 2018H033750 Yayın Alımı Projesi	17
2.2.5. 2018H033770 Üniversite Bilgi Sistemi	17
2.2.6. Kamulaştırma	19
<b>3. 2018 Yılı Yatırım Projeleri Listesi</b>	<b>20</b>
<b>4. 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>21</b>

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
**2018 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU**

**1. GENEL DEĞERLENDİRME**

**1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları**



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin toplam proje bedeli 89.479.000 ₺ tutarındadır.

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 27.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	15.874	5.002
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	65.607	14.000
2018 H 050 610	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000	1.000
2018 H 033 210	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	120	120
2018 H 033 650	Muhtelif İşler	5.826	5.826
2018 H 033 750	Yayın Alımı	800	800
2018 H 033 770	Üniversite Bilgi Sistemi	250	250
Kamulaştırma		2	2
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>89.479</b>	<b>27.000</b>

2018 yılı içerisinde ihtiyalar doęrultusunda 18.671.164 ₺ tutarında net finansman ve iki bilimsel arařtırma projesi iin ise 38.169 ₺ tutarında eř finansman kullanılarak toplam 45.709.333 ₺ tutarına ulařmıř ve toplam 44.702.098,07 ₺ tutarında harcama yapılmıřtır.

Yıl iinde niversitemiz yatırım projelerine iliřkin 4denek ihtiyaını karřılamak iin gerekli hallerde projeler ve altprojeler arası 4denek aktarma ve likit karřılıęı 4denek ekleme yollarına gidilmiřtir.

## **1.2. niversitemizin Mevcut Hizmet / retim Kapasitesi**


Bartın niversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuřtur. niversitemiz, Edebiyat Fakltesi, Eęitim Fakltesi, Fen Fakltesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi, İslami İlimler Fakltesi, Mhendislik Fakltesi, Orman Fakltesi, Saęlık Bilimleri Fakltesi, Eęitim Bilimleri Enstits, Fen Bilimleri Enstits, Sosyal Bilimler Enstits, Beden Eęitimi ve Spor Yksekokulu, Yabancı Diller Yksekokulu, Meslek Yksekokulu, Saęlık Hizmetleri Meslek Yksekokulu ile Ulus Meslek Yksekokulu olmak zere toplam 8 Faklte, 3 Enstit, 2 Yksekokul, 3 Meslek Yksekokulu ile 12 Uygulama ve Arařtırma Merkezinden oluřmakta ve eęitim faaliyetini srdrmektedir.

2018 yılı ierisinde 564 akademik personel, 254 idari personel ve 130 srekli iři olmak zere toplam 948 personel ile 16.790 4ęrenciye hizmet verilmiřtir.



niversitemiz Aędacı Kamps, Bartın Őehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Aędacı Mahallesiinde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi zerinde yer almaktadır.

Aędacı Kampsnde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi, Orman Fakltesi, Saęlık Bilimleri Fakltesi, Fen Bilimleri Enstits, Sosyal Bilimler Enstits, Yabancı Diller Yksekokulu, Meslek Yksekokulu, Saęlık Hizmetleri Meslek Yksekokulu, atlye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

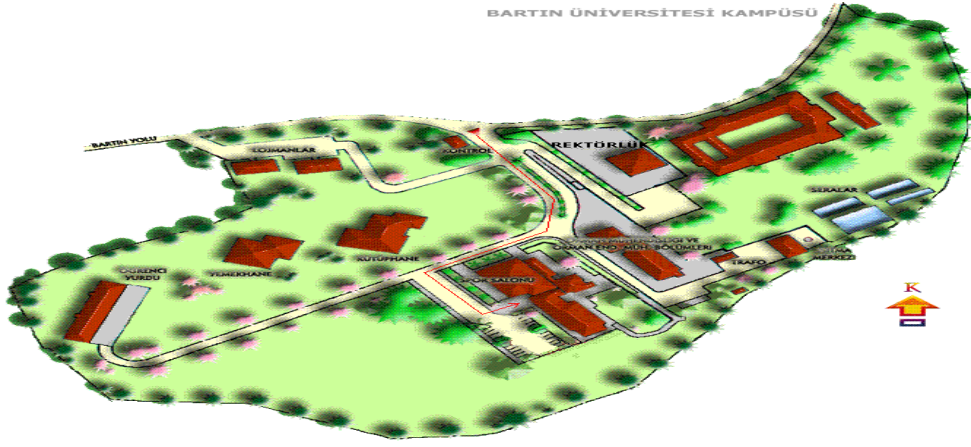

Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

<b>Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları</b>	<b>87.520</b>
<b>Eğitim</b>	<b>22.145</b>
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	3.730
Orman Fakültesi Binası	11.400
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yunus Emre Dersliği	1.105
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Prefabrik Laboratuvar	120
<b>İdari</b>	<b>1.555</b>
Rektörlük	1.555
<b>Mediko Sosyal</b>	<b>98</b>
Mediko Sosyal	98
<b>Beslenme</b>	<b>1.627</b>
Yemekhane	1.627
<b>Kültür</b>	<b>3.235</b>
Kütüphane Binası	3.235
<b>Spor</b>	<b>1.740</b>
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>3.650</b>
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
<b>Diğer</b>	<b>1.118</b>
Atıksu Arıtma	283
Jeneratör Binası	85
Kazan Dairesi	340
Mobilya Atölyesi	320
Kampüs Girişi	90
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>35.168</b>
<b>Açık Spor Alanları Toplamı</b>	<b>9.818</b>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>44.986</b>

Kutlubey Kampüs alanımız olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m<sup>2</sup>'lik alana sahiptir.

Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 yılında tamamlanmış olup 2014-2015 akademik yılında Mühendislik Fakültesi, 2015-2016 akademik yılında ise Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.



Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Binalarının tamamlanmasıyla 2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi, 2017-2018 akademik yılında ise Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binası 2016 yılında tamamlanmış olup 2016-2017 akademik yılında öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.


2015 yılı 1 Blok 24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Açık Spor Sahaları Yapımının 2018 yılında tamamlanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.



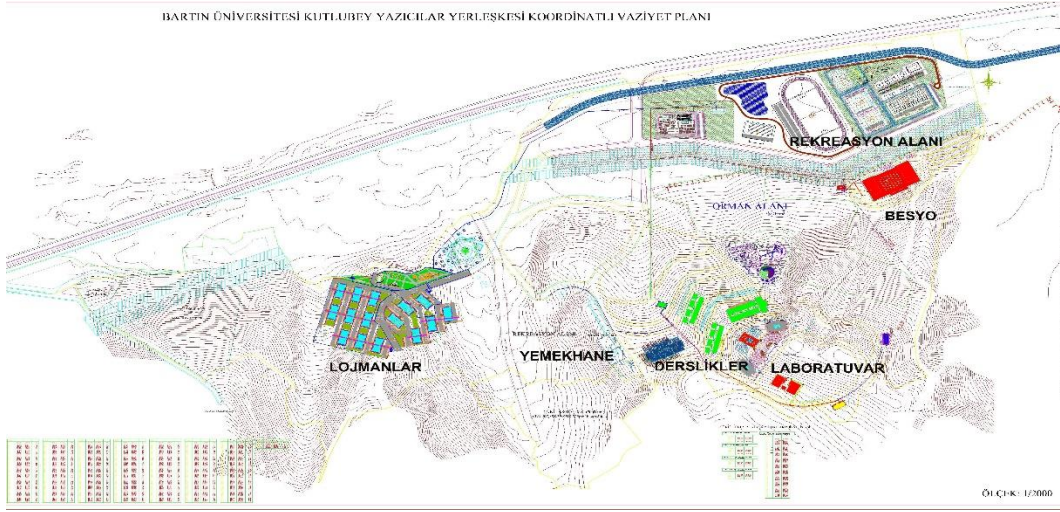

**Kutlubey Kampüsü Genel Görünüş**

<b>Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları</b>	<b>1.090.699,72</b>
<b>Eğitim</b>	<b>24.701</b>
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
Kapalı Spor Salonu ve Besyo Binası (Eğitim Alanı)	4.285
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
<b>İdari</b>	<b>18.308</b>
Edebiyat, Eğitim, İslami İlimler Fakülteleri ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü İdari Binası	9.518
Mühendislik ve Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
<b>Beslenme</b>	<b>8.478</b>
Yemekhane	8.478
<b>Spor</b>	<b>12.492</b>
Kapalı Spor Salonu ve Besyo Binası (Spor Alanı)	12.492
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>4.744</b>
Lojman	4.744
<b>Diğer</b>	<b>765</b>
Kampüs Girişi	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>69.488</b>

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

### 1.3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

### 1.4. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 27.000.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerinde ihtiyaçlar gereği 18.671.164 ₺ tutarında net finansman kullanılarak toplam ödenek 45.671.164 ₺ tutarına ulaşılmış ve toplam 44.663.929,92 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %165, toplam ödeneğe göre %98 olarak tespit edilmiştir.

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Kaydı	Projeler Arası Aktarma	Toplam Yatırım	Harcama	
<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.097.129</b>	<b>+</b>	<b>2.772.102</b>	<b>31.869.231</b>	<b>31.869.230</b>
BESYO Binası	2.000.000	247.961	+	283.597	2.531.558	2.531.558
Kütüphane Binası	2.000.000	2.260.638	+	6.282.165	10.542.802	10.542.802
Laboratuvar Binası	2.250.000	4.250.000	-	6.500.000	-	-
Merkezi Derslik	(2.270.000)	-	-	-	-	-
Öğrenci Yaşam Merkezi	1.000.000	5.250.592	+	3.388.932	9.639.524	9.639.524
Rektörlük Binası	6.750.000	3.087.938	-	682.591	9.155.347	9.155.346
<b>Çeşitli İşlerin Etüd Projesi</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>17.234</b>	<b>137.234</b>	<b>137.234</b>
<b>Kampüs Altyapısı</b>	<b>5.002.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.924.744</b>	<b>1.077.256</b>	<b>755.753</b>
<b>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</b>	<b>1.000.000</b>	<b>73.723</b>		<b>-</b>	<b>1.073.723</b>	<b>805.374</b>
<b>Muhtelif İşler</b>	<b>5.826.000</b>	<b>3.437.112</b>	<b>+</b>	<b>1.135.408</b>	<b>10.398.520</b>	<b>9.983.475</b>
Kesin Hesap	-	-	+	1.109.094	1.109.094	1.106.094
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	250.000	71.516		-	321.516	320.161
Makine -Teçhizat	4.826.000	2.715.000		-	7.541.000	7.139.034
Bakım - Onarım	750.000	650.596	+	26.314	1.426.910	1.418.185
<b>Yayın Alımı</b>	<b>800.000</b>	<b>30.000</b>		<b>-</b>	<b>830.000</b>	<b>829.664</b>
<b>Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi</b>	<b>250.000</b>	<b>33.200</b>		<b>-</b>	<b>283.200</b>	<b>283.200</b>
<b>KAMULAŞTIRMA</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>			<b>2.000</b>	<b>-</b>
<b>KURUM TOPLAMI</b>	<b>27.000.000</b>	<b>18.671.164</b>		<b>-</b>	<b>45.671.164</b>	<b>44.663.930</b>

## **2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI**

### **2.1. Devam Eden Projeler**

#### **2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi**

2018 Yılı Yatırım Programı ile 5.002.000 ₺ ödenek tahsis edilen Kampüs Altyapısı Projesine 755.752,94 ₺ tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu projeden, Çeşitli İşlerin Etüd Projesine 17.234 ₺, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2.772.101,78 ₺ ve Muhtelif İşler Projesine 1.135.408,41 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır. Yapılan aktarmalar sonucu proje ödeneği 1.077.256 ₺ olan projenin harcama oranı %70'tir.

Proje kapsamında Kutlubey Kampüsü Su Deposu Yapım İşleri gerçekleştirilerek proje tamamlanmış ve geçici kabul yapılmıştır. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 1.260.141,18 ₺ olup 2017 yılında 504.388,24 ₺ ve 2018 yılında 755.752,94 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.



**Kutlubey Kampüsü Su Deposu Yapım İşleri**

#### **2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

2018 yılı proje bedeli 14.000.000 ₺ olan bu projede Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası, Kütüphane Binası, Merkezi Derslik Binası, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi altprojeleri yer almaktadır.

Yoğun olarak yapım işine dayanan bu projede altproje hakedişlerinin gecikme yaşanmadan ödenebilmesi için toplam 15.097.129 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile Kampüs Altyapısı projesinden 2.772.101,78 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır. Toplam ödeneği 31.869.230,78 ₺ tutarına ulaşan projeden 31.869.230,13 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



**Kutlubey Kampüsü Genel Görünüş**

**a) Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu İkmal Yapım İşi**

2017 yılında sözleşme bedeli (KDV dahil) 21.785.723,77 ₺ olan Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binasının yapımı için toplam 20.632.665,88 ₺ ödeme yapılmıştır. Ancak bu yapım işine ilişkin sözleşme feshedilmiş olup ikmal inşaatı ihalesine çıkmıştır.

2018 yılında Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu İkmal Yapım İşinin sözleşme Bedeli (KDV dahil) 2.531.557,83 ₺ olup 2.531.557,83 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.

Proje tamamlanmış, geçici kabulü devam etmektedir.



**Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu**

**b) Kütüphane Binası Yapım İşi**

Sözleşme bedeli (KDV dahil) 17.808.430,70 ₺ tutarında olan Kütüphane Binası Yapım İşi için 2018 yılında 10.542.802 ₺ tutarında, toplamda ise 17.021.153,61 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.



**Kütüphane Binası Yapım İşi**

### c) Rektörlük Binası Yapım İşi

Sözleşme bedeli (KDV dahil) 19.878.793,07 ₺ olan Rektörlük Binası Yapım İşi 2017 yılı sonunda başlamış olup 2018 yılında bu iş için 9.155.345,97 ₺ tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.



Rektörlük Binası Yapım İşi

### d) Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi

Sözleşme bedeli (KDV dahil) 10.851.310,89 ₺ olan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi 2017 yılı sonunda başlamış olup 2018 yılında bu iş için 9.639.523,88 ₺ tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.



Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi

### e) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Sözleşme Bedeli (KDV dahil) 32.652.960,00 ₺ olan Laboratuvar Binası Yapım İşi 2018 yılı sonunda başladığından ödeme gerçekleşmemiştir.

### f) Derslik Binası Yapım İşi

Sözleşme Bedeli (KDV dahil) 44.193.360 ₺ olan Derslik Binası Yapım İşi 2018 yılı sonunda başladığından ödeme gerçekleşmemiştir.



Derslik Binası Yapım İşi

## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. 2018 H 050 610 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2018 yılı ödeneği 1.000.000 ₺ olan proje 2016 yılında başlayan Açık Spor Sahaları Yapım İşi devam etmektedir. 2017 yılsonu itibarı ile 1.464.994,47 ₺ ödenek harcanan bu proje için 2018 yılında 805.374,31 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır.



## Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapım İşi

### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H050610			2018H050610		
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri			Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Sektör/Altsektör	Beden Eğitimi ve Spor / Yükseköğretim			Beden Eğitimi ve Spor / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (2 adet), Voleybol Sahası (2 adet)			Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (2 adet), Voleybol Sahası (2 adet)		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2018 - 31/12/2018			01/01/2018 - 31/12/2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
1.073		1.000			1.073	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2018		805			805	

### 2.2.2. 2018 H 033 210 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

2018 yılı ödeneği 120.000 ₺ olan ve Kampüs Altyapısı projesinden 17.234 ₺ tutarında aktarma yapılan bu projeden “Eğitim Fakültesi Binası” ve “Laboratuvar Binası” Projelerinin Hazırlanması İşi tamamlanmış olup toplam 137.234 ₺ tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.



Eğitim Fakültesi Binası Projesi





**Laboratuvar Binası Projesi**

### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2018H033210			2018H033210		
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi			Çeşitli İşlerin Etüd Projesi		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
<b>Fiziki Hedefi</b>	%100			%100		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2018 - 31/12/2018			01/01/2018 - 31/12/2018		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
137		120			137	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2018		137			137	

#### 2.2.3. 2018 H 033 650 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2018 mali yılında 5.826.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 3.437.112 ₺ ödenek eklenmiş ve 1.135.408,41 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır. Yılsonunda toplam 10.398.520,41 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 9.983.474,86 ₺ tutarı harcanmıştır.

Bu proje kapsamında 250.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen ve yıl içerisinde 71.516 ₺ tutarında ödenek eklenerek toplam ödeneği 321.516 ₺ tutarına ulaşan Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yapılan harcamalar şöyledir:

<b>Alım Türü</b>	<b>Tutar (₺)</b>
Microsoft Office Lisans Alımı	129.771,44
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı	33.000,00
MATLAB Lisans Alımı	71.154,00
Sanallaştırma Yazılımı Lisansı	33.748,00
COMODO Korumalı Mail Lisansı	25.783,00
İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı	15.585,44
TÜBİTAK E-İmza Ödemeleri	11.119,14
<b>TOPLAM</b>	<b>320.161,02</b>

Makine – teçhizat alımları için 4.826.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen projeye İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının talebi ile 2.715.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneği 7.541.000 ₺ tutarına ulaşan projeden üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar alım türü olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

<b>Alım Türü</b>	<b>Adet</b>	<b>Tutar</b>
Bilgisayar Alımları	351	1.779.964,96
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	3.251	1.662.731,29
Büro Makine Alımları	123	25.633,08
Diğer Avadanlık Alımları	759	138.922,33
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	301	2.735.039,25
Laboratuvar Cihazı Alımları	151	697.342,90
Tıbbi Gereçler Alımları	12	99.400,33
<b>TOPLAM</b>	<b>4.948</b>	<b>7.139.034,14</b>

Gerçekleştirilen makine-teçhizat alımlarının birimlere göre harcama tutarı:

<b>Birim Bazında Makine-Teçhizat Alım Giderleri</b>		
<b>Fakülteler</b>		<b>877.935,15</b>
Edebiyat Fakültesi	74.263,14	
Eğitim Fakültesi	53.185,51	
Fen Fakültesi	210.903,51	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	21.457,82	
İslami İlimler Fakültesi	25.611,47	
Mühendislik Fakültesi	475.566,66	
Orman Fakültesi	16.947,04	
<b>Enstitüler</b>		<b>4.485,40</b>
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	4.485,40	
<b>Yüksekokullar</b>		<b>692.777,30</b>
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	692.182,00	
Yabancı Diller Yüksekokulu	595,30	
<b>Meslek Yüksekokulları</b>		<b>188.504,89</b>
Bartın Meslek Yüksekokulu	96.507,80	
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	79.119,24	
Ulus Meslek Yüksekokulu	12.877,85	
<b>Araştırma Merkezleri</b>		<b>201.177,43</b>
Merkezi Araştırma Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi	170.834,86	
Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi	5.857,57	
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	24.485,00	
<b>Koordinatörlükler</b>		<b>131.635,32</b>
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	131.635,32	
<b>Rektörlük</b>		<b>1.693,30</b>
<b>Genel Sekreterlik</b>		<b>25.859,70</b>
<b>Daire Başkanlıkları</b>		<b>5.014.965,65</b>
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	365.174,13	
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.016.445,01	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.787.142,30	
Personel Daire Başkanlığı	22.345,73	
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	20.281,09	
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	803.577,39	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>7.139.034,14</b>

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 750.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 650.596 ₺ tutarında ödenek kaydı ve 26.314 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır.

Toplam ödeneği 1.426.910 ₺ tutarına ulaşan bu altprojeden 1.418.185,29 ₺ tutarında büyük bakım onarım gideri harcaması yapılmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca proje kapsamında büyük onarım giderlerine ilişkin ihale edilen işler aşağıda gösterilmiştir.

Alım Türü	Tutar (₺)
2018 Yılı Kutlubey Kampüsü Bakım Onarım İşİ	362.260
Ağdacı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Mantolama İşİ	214.996
2018 Yılı Ağdacı Kampüsü Bakım Onarım İşİ	377.600
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO' da Bulunan Asansörlerin 2018 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Asansör Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	67.968
Bakım-Onarım Kapsamında Doğrudan Temin Alımları	404.086
<b>TOPLAM</b>	<b>1.418.185</b>

Ayrıca Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde yer alan TOKİ ile yapılan protokol gereği Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşİ için 2018 yılında 1.106.094,41 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.

### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H033650			2018H033650		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2018 - 31/12/2018			01/01/2018 - 31/12/2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
10.399		5.826			10.399	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2018		9.984			9.984	

#### 2.2.4. 2018 H 033 750 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2018 mali yılında 800.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 30.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneği 830.000 ₺ olan projeden 829.663,68 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	509.455,26
Kitap Alımı	303.064,46
E-Kitap Alımı	17.143,96
<b>TOPLAM</b>	<b>829.663,68</b>


#### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H033750			2018H033750		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2018 - 31/12/2018			01/01/2018 - 31/12/2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
830		800			830	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2018		830			830	

#### 2.2.5. 2018 H 033 770 Üniversite Bilgi Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2018 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2018 yılı proje ödeneği 250.000 ₺ olan projeye 33.200 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve hakediş ödemeleri için KDV dahil toplam 283.200 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



### **Kullanılmakta Olan Modüller**

Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünün altına yeni eklenen modüller de aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ ÖSYM Önkayıt
- ✓ Enstitü Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
- ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
- ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
- ✓ Farabi Başvurusu
- ✓ Mevlana Başvurusu
- ✓ Erasmus Başvurusu
- ✓ Formasyon Başvurusu
- ✓ Özel Yetenek Sınavı Başvurusu (BESYO)
- ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu

## Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H033770			2018H033770		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Sistemi			Üniversite Bilgi Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2018 - 31/12/2018			01/01/2018 - 31/12/2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
283		250			283	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
<i>Programa Alındığı Yıl</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2018		283			283	

### 2.2.6. Kamulaştırma

Üniversitemize 2018 yılında 2.000 ₺ tutarında Kamulaştırma ödeneği tahsis edilmiştir. Kamulaştırma kapsamında harcama yapılmıştır.

### 3. 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Sektör Adı** : Eğitim

Bin TL, 2018 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H0 30440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2020	Bartın		15.874	8.872			5.002	-	3.925			756
2009H0 30450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2020	Bartın		65.607	14.107			14.000	+	17.869			31.869
2018H0 50610	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2018	Bartın		1.000				1.000	+	74			805
2018H0 330210	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2018	Bartın		120	-			120	+	17			137
20187H 033650	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2018	Bartın		5.826	-			5.826	+	4.573			9.984
2018H0 33750	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2018	Bartın		800	-			800	+	30			830
2018H0 33770	Üniversite Bilgi Sistemi	Özel Bütçe	2018	Bartın		250	-			250	+	33			283
Kamulaştırma						2	-			2					0
<b>TOPLAM</b>						<b>89.479</b>	<b>22.979</b>			<b>27.000</b>	<b>+</b>	<b>18.671</b>			<b>44.664</b>



#### 4. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7	-	89.479	-	-	22.979	-	-	27.000	-	-	+18.671	-	-	44.664
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>89.479</b>	-	-	<b>22.979</b>	-	-	<b>27.000</b>	-	-	<b>+18.671</b>	-	-	<b>44.664</b>

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

+90 378 223 54 99



+90 378 223 50 42



<http://www.bartın.edu.tr>

