




BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

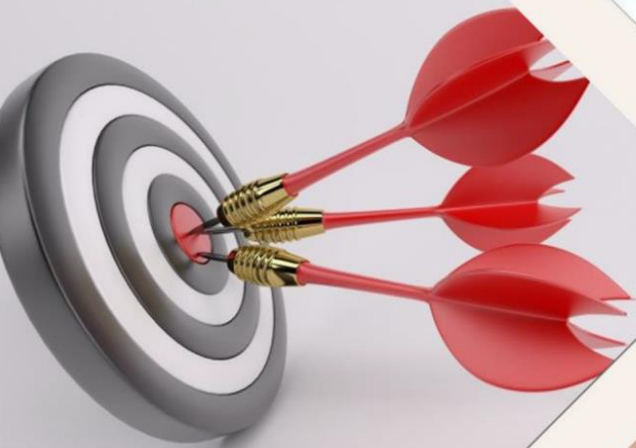

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



Ağdacı Kampüsü Girişi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2022 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 135.371.000 TL tutarındadır. Ancak İhtisaslaşma Projesinin proje bedelinin Cumhurbaşkanlığı izni ile 57.200.000 TL olarak revize edilmesi ile birlikte proje bedeli 151.271.000 TL tutarına ulaşmıştır.

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik koduna 50.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	21.569.000	1.000.000
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	64.000.000	35.500.000
2022H03-186372	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	100.000	100.000
2022H03-186382	Muhtelif İşler	6.052.000	6.050.000
2022H03-186378	Yayın Alımı	2.000.000	2.000.000
2022H03-186539	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	350.000
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	41.300.000	5.000.000
GENEL TOPLAM		135.371.000	50.000.000

Not : 2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 57.200.000 olarak revize edilmiştir

2022 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 10.721.862 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 30.000 TL tutarında şartlı bağış ve yardımların devri, ve 8.200.000 TL tutarında ek bütçe gerçekleştirilerek toplam ödenek 68.951.862 TL tutarına ulaşmış ve toplam 49.693.097 TL tutarında harcama yapılmıştır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2022 yılsonu itibarı ile 683 akademik personel, 263 idari personel, 150 sürekli işçi ve 54 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.150 personel ile 18.512 öğrenciye hizmet verilmiştir.



Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş

Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesi'nde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Kampüsünde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.

Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m²)	87.520
Eğitim	22.145
Orman Fakültesi Binası	11.400
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası	3.730
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Yunus Emre Dersliği	1.105
Prefabrik Laboratuvar	120
İdari	1.555
Rektörlük	1.555
Mediko Sosyal	98
Mediko Sosyal	98
Beslenme	1.627
Yemekhane	1.627
Kültür	3.235
Kütüphane Binası	3.235
Spor	1.740
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
Sosyal Tesis	3.650
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
Diğer	1.118
Atıksu Arıtma Tesisi	283
Isı Merkezi	340
Jeneratör Binası	85
Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90
Mobilya Atölyesi	320
Kapalı Alanlar Toplamı	35.168
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818
Toplam Fiziki Alan	44.986

Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²'lik alana sahiptir.

Kutlubey Kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, yapımı yeni biten Engelsiz Yaşam Alanı Merkez Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, 2023 yılının ilk 6 ayında taşınması planlanan rektörlük binası, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.

Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında tamamlanmasıyla birlikte Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014-2015 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapım işi 2017 yılında tamamlanmıştır. 2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1) , 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapı işi 2017 yılında tamamlanmış aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Kampüsünde Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m²)	1.090.699,72
Eğitim	42.469
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası	18.968
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
Engelsiz Yaşam Alanı	3.085
İdari	42.431
Rektörlük Binası	11.137
Edebiyat ve İslami İlimler Fakültesi İdari Binası	9.518
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
Kütüphane Binası	10.599
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387
Beslenme	8.478
Yemekhane	8.478
Spor	16.777
Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası	16.777
Sosyal Tesis	4.744
Lojman	4.744
Diğer	765
Kampüs Girişi	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
Kapalı Alanlar Toplamı	115.664
Açık Spor Alanları Toplamı	3.584

Kutlubey Kampüsünde, 2022 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ise Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası yapım işleri ile Muhtelif İşler Projesi Kesin Hesap alt projesi kapsamında Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Projesi sürdürülmüştür.



2022 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun programlarının bir kısmı Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; 3.212 m²'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3.2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

Tablo 4: 2022 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m²)	25.469
Rektörlük Binası *	11.137
Laboratuvar Binası	14.332
Toplam Alan	25.469

Not : * Rektörlük Binasının yapımı tamamlanmış olup 2023 yılının ilk 6 ayında taşınması planlanmaktadır.

Bu çerçevede 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4’te yer almakta olup ayrıca önceki yıllarda yapımı büyük ölçüde tamamlanan Merkezi Derslik Binası Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde yürütülmüştür.



2022 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

1.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 50.000.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 10.721.862 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 30.000 TL tutarında şartlı bağış ve yardımların devir kaydı, 8.200.000 TL tutarında ek bütçe aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 68.951.862 TL tutarına ulaşmış ve toplam 49.693.097 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %99, toplam ödeneğe göre %72 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Ek Bütçe Likit Kaydı, Şartlı Bağış ve Yardımın Devri	Projeler Arası Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	1.000.000,00	1.900.000,00	0	2.900.000,00	2.881.211,19
Derslik ve Merkezi Birimler	35.550.000,00	5.200.000,00	- 8.734.100,00	32.015.900,00	13.295.123,11
Laboratuvar Binası	28.750.000,00	0	- 10.834.100,00	17.915.900,00	237.287,58
Rektörlük Binası	6.800.000,00	5.200.000,00	+ 2.100.000,00	14.100.000,00	13.057.835,53
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	100.000,00	0	0	100.000,00	64.900,00
Muhtelif İşler	6.000.000,00	6.851.862,00	+ 8.734.100,00	21.585.962,00	21.121.189,24
Kesin Hesap	0	1.021.862,00	+ 1.200.000,00	2.221.862,00	2.221.861,57
Bilgi ve İletişim Tekno.	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	999.800,47
Makine -Teçhizat	3.400.000,00	0	+ 7.284.100,00	10.684.100,00	10.588.379,51
Taşıt	0	30.000,00	0	30.000,00	27.188,00
Bakım - Onarım	1.600.000,00	5.800.000,00	+ 250.000,00	7.650.000,00	7.283.959,69
Yayın Alımı	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	1.990.833,91
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000,00	0	0	350.000,00	339.840,00
İhtisaslaşma	5.000.000,00	5.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00
KURUM TOPLAMI	50.000.000,00	18.951.862,00	0	68.951.862,00	49.693.097,45

2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2022 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 21.569.000 TL, 2022 yılı ödeneği ise 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 1.900.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı eklenerek toplam ödenek 2.900.000 TL tutarına ulaşmıştır.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanına Enerji Getirme, Trafo Postası, Jeneratör Tesisi ve Gölet Alanına Aydınlatma Yapılması İşi kapsamında 13.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.872.660,00TL'dir.



Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karşısı Parke Yapım İşi kapsamında 20.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 681.447,62 TL' dir.



2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2022 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 64.000.000 TL, 2022 yılı ödeneği ise 35.500.000 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası alt projeleri yer almaktadır.

a) Rektörlük Binası Yapım İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında yapım ihalesi 15.02.2021 tarihinde yapılmış olup, 17.582.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 15.03.2021 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. 2022 yılında KDV + fiyat farkı dahil 13.057.835,53 TL ödeme gerçekleşmiş olup, fiziksel gerçekleşmesi % 99 olarak hesaplanmıştır.



Rektörlük Binası Yapım İşi

b) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında Yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 2020 Program Yılı Ödeneği iz bedel olarak takip edildiğinden dolayı yapım işi uzamıştır. 2022 yılında 237.287,58 TL harcama yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır.



Laboratuvar Binası Yapım İşi

2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi

2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak yıl içerisinde Üniversitemiz talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen izin ile İhtisaslaşma Projemizin proje ödeneği 57.200.000 TL olarak revize edilmiştir. İhtisaslaşma projesinin başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olarak tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 5.000.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Toplam ödenek 10.000.000 TL tutarına ulaşmış olup bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2022H03-186372 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2022 yılı ödeneği 100.000 TL olan projeden 64.900 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2022H03-186372			2022H03-186372		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	%65			%65		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2022 - 31/12/2022			01/01/2022 - 31/12/2022		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		100			100	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2022 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2022		65			65	

2.2.2. 2022H03-186382 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2022 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 1.000.000 TL, makine-teçhizat alımları için 3.400.000 TL ve gayrimenkul bakım onarımları için 1.600.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Ayrıca daha önce Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde yer alan Merkezi Derslik Binasının yapımına başlanmış ancak ikmal işlerinin tamamlanabilmesi için 2022 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin

Hesap alt projesinde izlenmiştir. Engelsiz Yaşam Alanı Binası da tamamlanmış ancak makine teçhizat alınabilmesi amacıyla 2022 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenmiştir.

2022 yılı içerisinde projenin Kesin Hesap alt projesinde yer alan Engelsiz Yaşam Alanına 800.000 TL, Merkezi Dersliğe 221.862 TL, bakım onarım alt projesine ise 2.800.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin Taşıt alt projesine ise 30.000 TL tutarında ödenek şartlı bağış ve yardımların devir kaydı olarak kaydedilmiştir. Muhtelif İşler projesinin bakım onarım alt projesine 3.000.000 TL ek bütçe verilmiştir. Laboratuvar Binası Yapım İşleri alt projesinden 8.734.100 TL tutarında ödenek Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 21.585.962 TL tutarına ulaşan projeden 21.121.189 TL harcanmıştır.

a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 1.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Tübitak E İmza ve Sertifika Alımı	105.397,60
Vmware Lisans Alımı	55.696,00
OSKA Hakediş ve Metraj Yazılımı Lisansı	7.000,00
Adobe Lisans Alımı	15.930,00
SSL Sertifika Alımı	1.650,82
Apple Developer Lisans Alımı	1.029,00
ZOOM Lisans Alımı	40.568,40
MATLAB Lisans Alımı	297.958,26
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı Lisans Alımı	164.000,00
KAMUTECH İşçi Yazılımı Lisans Alımı	27.083,56
EPATİ Tünelleme Lisans Alımı	72.650,00
Mplus Lisans Alımı	23.836,00
SiEM Yazılımı Lisans Alımı	82.600,00
Smart PLS Lisans Alımı	12.803,00
NETCAD Lisans Alımı	22.500,00
ESRİ Lisans Alımı	29.998,53
Kablosuz Cihaz Güncelleme Yazılımı Alımı	39.099,30
TOPLAM	999.800,47

b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat alt projesi kapsamında 1.350.000 TL tutarında ödenek Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 2.050.000 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2022 yılı ödeneği 3.400.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 10.684.100 TL tutarına ulaşmıştır.

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları için ödeneği 7.850.000 TL olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
IP Telefon Alımı	165.176,40
Switch Alımı	732.916,56
Ses Mikseri Alımı	78.470,00
Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Projeksiyon Cihazı Alımı	6.684.988,51
Güvenlik Kamerası ve NVR Kayıt Cihazı Alımı	83.998,30
Çöp Kovası Alımı	49.855,00
Ses Kayıt Cihazı ve İp Kamera Alımı	5.664,00
TOPLAM	7.801.068,77

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları ödeneği 2.834.100 TL olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü bazında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Alımları Tablosu

Alım Türü
Büro Mefruşatı Alımları
İşyeri Mefruşatı Alımları
Okul Mefruşatı Alımları
Diğer Mefruşat Alımları
Büro Makineleri Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları
Laboratuvar Cihazı Alımları
İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları
Diğer Avadanlık Alımları

c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1.600.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2.800.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiş, 3.000.000 TL ek bütçe verilmiş ve 250.000 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 7.650.000 TL'ye ulaşmıştır.

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 7.650.000 TL tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 7.283.959,69 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında Yapılan Doğrudan Teminler

İşin Adı
Kutlubey Kampüsündeki Binaların Doğalgaz Servis Kutusundan İtibaren Brülöre Kadar Doğalgaz Kaçaklarının Giderilmesi İçin Bütün Dışlı Bağlantıların Sökülüp Bakım Onarımlarının Yapılması İşleri
Kutlubey Yerleşkesi Hurda Deposu Yapım İşleri
A.Y. İMİD Depo İçine Alçıpan Duvar Yapım ve Muhtelif Bakım Bakım Onarım
SHMY Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne ait Lab.daki Zemine Epoksi Zemin Kaplama İşleri
Spor Bilimleri Fakültesi Muhtelif Yerlerdeki Seramik Çatlak, Kırık Ve Derzlerin Onarımı ile Oturmada Kaynaklı Silikon Cephe Camlarının Tadilatlarının Yapılması İşleri
Kütüphane Binası ve Eğitim Fakültesi Havalandırma Cihazlarının Bakım Onarımı
Kutlubey Ağdacı Yerleşkesi ve Topalali Su Kuyusu tesisat ve bakım onarım işleri
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2022 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Alınması İşleri
Kutlubey Kampüsü alanındaki Arıtma Tesisinin 2022 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınması İşleri
Bartın Üniversitesi Kırmızı ve Sarı etiket Alınan Asansörlerin Yeşil Etikete Çevrilmesi İçin Asansörlerde Yapılması Gereken Tadilat İşleri
Medikososyal Birimine Alçıpan Bölme duvar işleri ve diğer muhtelif işleri
Ağdacı Kampüsü Su Hattının Acilen Onarımı İçin Tesisat Malzemesi Alımı
AR-GE Pazarında Elektrik Tesisatında Kullanılmak Üzere 12 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı

Kutlubey Yerleşkesi ve Ulus MYO'da Bulunan Tüm Binaların Çatı Olukları ve Giderlerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi
Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası, Duvar Boya ve Elektrik İşlerinin Yapılması ile Kurucuşile Meslek Yüksek Okulu Binasının Çatısının Güçlendirilmesi ve Olukların Bakımının Yapılması İşi
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Durak Altyapı Bakım Onarım İşi
2022 Kutlubey Yerleşkesi Muhtelif Yerlerde Bozulan Parke ve Yol ve Kaldırımların Onarılması ve Su Hattının Çekilmesi İşi
Üniversitemiz Kutlubey Yerleşkesinde Mevcut Binalara Ait Yangın Algılama Sistemlerinin Bakımlarının Yapılması İşi
Mehmet Akif Ersoy Dersliği ve Yemekhane Binası Mutfak Kısımındaki Doğalgaz Tesisatındaki Kaçakların Giderilerek Tamiratının Yapılması İşi
İnşaat Malzemesi Alımı

d) Kesin Hesap

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan bu alt projede önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde tamamlanan Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının işleri yürütülmüştür.

Merkezi Derslik Yapım İşi

2022 yılında Muhelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenen Merkezi Derslik Binasına 221.862,00 TL likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Merkezi Derslik Binası için 2022 yılında 221.861,57 TL harcama olmuştur.



Engelsiz Yaşam Alanı Projesi

Üniversitemiz ile BAKKA arasında 2018 yılında sözleşmesi yapılarak 2020 yılında ihale süreci başlayan bu güdümlü proje; 20.000 m² açık alan ve 3.070,74 m² kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilmiş olup içerisinde özel eğitim ve rehabilitasyon binası, konaklama tesisi, bilişsel araştırma laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru ve evcil hayvanlar birimleri gibi birçok uygulama biriminin yer aldığı kapsamlı bir projedir.

Her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri; sunulan rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanacaktır.

2022 yılı içerisinde donanım malzemeleri alınabilmesi amacıyla 800.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı olarak eklenmiş, 1.200.000 TL ödenek aktarılmış olup bu tutarlar proje özel hesabına aktarılmıştır.



Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2022H03-186382			2022H03-186382		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, T-18 (2 adet), T-20 (5 adet), T-5 (2 adet)			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, T-18 (2 adet), T-20 (5 adet), T-5 (2 adet)		
Fiziki Hedefi	%98			%98		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2022 - 31/12/2022			01/01/2022 - 31/12/2022		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
		6.052			21.585	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2022 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
2022		21.121			21.121	

2.2.3. 2022H03-186378 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2022 mali yılında 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 1.990.833,91 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı Projesi	TL
Basılı Kitap Alımı (İhale)	381.355,69 TL
Basılı Kitap Alımı (Doğrudan Temin)	54.672,66 TL
Elektronik Yayın Alımı	1.554.805,56 TL
TOPLAM	1.990.833,91 TL

Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2022H03-186378			2022H03-186378		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2022 - 31/12/2022			01/01/2022 - 31/12/2022		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2.000			2.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2022 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2022		1.990			1.990	

2.2.4. 2022H03-186539 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2022 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2022 yılı proje ödeneği 350.000 TL olan projeden UBYS hak ediş ödemeleri için toplam 339.840 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller

1. Öğrenci Bilgi Sistemi
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi
3. Personel Bilgi Sistemi
4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi
5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi
7. Akademik Performans Bilgi Sistemi
8. Malzeme Yönetim Sistemi
9. Etik Kurullar Sistemi
10. Mezun Takip Sistemi
11. Ek Ders Bilgi Sistemi
12. Kurumsal Değerlendirme Analizi
13. Online İlişik Kesme Süreci
14. Anket Yönetim Sistemi
15. RİMER
16. UBYS Mobil Uygulama
17. Servis Talep Takip Sistemi
18. Sistem ve Organizasyon Yönetimi
19. Akademik Personel Online Başvuru Süreci Sistemi
20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi
21. Başvuru İşlemleri
 - ✓ ÖSYM Ön kayıt
 - ✓ Enstitü Başvurusu
 - ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu

- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
 - ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
 - ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
 - ✓ Farabi Başvurusu
 - ✓ Mevlana Başvurusu
 - ✓ Erasmus Başvurusu
 - ✓ Formasyon Başvurusu
 - ✓ Özel Yetenek Sınav Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi için özel hazırlanmıştır.)
 - ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu olmak üzere 21 farklı modül kullanılmaktadır.
- Ayrıca UBYS bünyesinde bulunan SKS Yönetim Sistemi ise geçiş aşamasındadır.

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186539			2022H03-186539		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	% 97			% 97		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2022 - 31/12/2022			01/01/2022 - 31/12/2022		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		350			350	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2022		340			340	

3. 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2022 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2021 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2023	Bartın		21.569	17.569			1.000	+	1.900			2.881
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2023	Bartın		64.000	20.900			35.500	-	3.534			13.295
2022H03-186372	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2022	Bartın		100				100		0			65
2022H03-186382	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2022	Bartın		6.052				6.050	+	15.585			21.121
2022H03-186378	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2022	Bartın		2.000				2.000		0			1.991
2022H03-186539	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2022	Bartın		350				350		0			340
TOPLAM						94.071	38.469			45.000	+	13.951			39.693

4. 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

Bin TL, 2022 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2021 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Özel Bütçe	2025	Bartın		57.200	1.300			5.000	+	5.000	0	0	10.000
TOPLAM						57.200	1.300	0	0	5.000	+	5.000	0	0	10.000

Not : 2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 57.200.000 olarak revize edilmiştir.

5. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	94.071	-	-	38.469	-	-	45.000	-	-	+ 13.951	-	-	39.693
Sağlık															
Dkh Sosyal Teknolojik Araştırma	1	-	57.200	-	-	1.300	-	-	5.000	-	-	+ 5.000	-	-	10.000
TOPLAM	7	-	151.271	-	-	39.769	-	-	50.000	-	-	+ 18.951	-	-	49.693
