



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**Mart 2020-Bartın  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

# İçindekiler

TABLO DİZİNİ .....	ii
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları .....	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi .....	2
1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme .....	6
1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları .....	7
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
2.1. Devam Eden Projeler.....	8
2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi .....	8
2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	8
2.2. Tamamlanan Projeler .....	12
2.2.1. 2019 H 035 720 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi.....	12
2.2.2. 2019 H 033 750 Yayın Alımı Projesi .....	12
2.2.3. 2019 H 035 730 Muhtelif İşler Projesi .....	13
2.2.4. 2019 H 035 750 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi.....	16
3. 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	18
4. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU .....	19

## TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2019 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺) .....	1
Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m <sup>2</sup> ) .....	3
Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m <sup>2</sup> ).....	5
Tablo 4: 2019 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar.....	6
Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu .....	7
Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu.....	12
Tablo 7: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu .....	12
Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	13
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu .....	13
Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu.....	14
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Birim Bazında Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu .....	14
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Harcamaları Tablosu.....	15
Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	16
Tablo 14: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller .....	16
Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu .....	17

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
**2019 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU**

**1. GENEL DEĞERLENDİRME**

**1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları**



**Ağdacı Kampüsü Girişi**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin toplam proje bedeli 150.641.000 ₺ tutarındadır.

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 18.720.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

**Tablo 1: 2019 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)**

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödenegi (Bin ₺)
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	20.573	1.701
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	123.049	10.000
2019 H 035 720	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50	50
2019 H 035 730	Muhtelif İşler	5.919	5.919
2019 H 033 750	Yayın Alımı	800	800
2019 H 035 750	Üniversite Bilgi Sistemi	250	250
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>150.641</b>	<b>18.720</b>

2019 yılı içerisinde ihtiyalar dođrultusunda 19.000.000 ₺ tutarında likit karřılıđı denek kaydı 24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı Cumhurbaşkanı Oluruna mteakip gerekleřtirilerek toplam denek 37.720.000 ₺ tutarına ulařmıř ve toplam 35.953.995,83 ₺ tutarında harcama yapılmıřtır.

Yıl iinde niversitemiz yatırım projelerine iliřkin denek ihtiyaını karřılamak iin gerekli hallerde projeler ve altprojeler arası denek aktarma ve likit karřılıđı denek ekleme yollarına gidilmiřtir.

## **1.2. niversitemizin Mevcut Hizmet / retim Kapasitesi**

Bartın niversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuřtur. niversitemiz, Edebiyat Fakltesi, Eđitim Fakltesi, Fen Fakltesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi, İslami İlimler Fakltesi, Mhendislik Mimarlık ve Tasarım Fakltesi, Orman Fakltesi, Sađlık Bilimleri Fakltesi, Spor Bilimleri Fakltesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Fen Bilimleri Enstits, Sosyal Bilimler Enstits, Yabancı Diller Yksekokulu, Meslek Yksekokulu, Sađlık Hizmetleri Meslek Yksekokulu ile Ulus Meslek Yksekokulu olmak zere toplam 9 Faklte, 3 Enstit, 1 Yksekokul, 3 Meslek Yksekokulu ile 13 Uygulama ve Arařtırma Merkezinden oluřmakta ve eđitim faaliyetini srdrmektedir.

2019 yılsonu itibarı ile 590 akademik personel, 259 idari personel ve 129 srekli iři olmak zere toplam 978 personel ile 17.420 đrenciye hizmet verilmiřtir.



**Ađdacı Kamps Genel Grnř**

niversitemiz Ağdacı Kamps, Bartın Őehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesiinde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi zerinde yer almaktadır.

Ağdacı Kampüsünde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

**Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m<sup>2</sup>)**

<b>Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m<sup>2</sup>)</b>	<b>87.520</b>
<b>Eğitim</b>	<b>22.145</b>
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	3.730
Orman Fakültesi Binası	11.400
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yunus Emre Dersliği	1.105
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Prefabrik Laboratuvar	120
<b>İdari</b>	<b>1.555</b>
Rektörlük	1.555
<b>Mediko Sosyal</b>	<b>98</b>
Mediko Sosyal	98
<b>Beslenme</b>	<b>1.627</b>
Yemekhane	1.627
<b>Kültür</b>	<b>3.235</b>
Kütüphane Binası	3.235
<b>Spor</b>	<b>1.740</b>
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>3.650</b>
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
<b>Diğer</b>	<b>1.118</b>
Atıksu Arıtma	283
Jeneratör Binası	85
Kazan Dairesi	340
Mobilya Atölyesi	320
Kampüs Girişi	90
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>35.168</b>
<b>Açık Spor Alanları Toplamı</b>	<b>9.818</b>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>44.986</b>



Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m<sup>2</sup>'lik alana sahiptir.

Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 yılında tamamlanmış olup 2014-2015 akademik yılında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2015-2016 akademik yılında ise Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binalarının tamamlanmasıyla 2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi, 2017-2018 akademik yılında ise Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.



**Kutlubey Kampüsü**

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binası 2016 yılında tamamlanmış olup 2016-2017 akademik yılında öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.

Kutlubey Kampüsü içerisinde 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Açık Spor Sahaları Yapımının 2018 yılında tamamlanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; ancak 18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2019 tarihli ve 968 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Ekiyle kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m<sup>2</sup>)

<b>Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.090.699,72</b>
<b>Eğitim</b>	<b>24.701</b>
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
Spor Bilimleri Fakültesi (Eğitim Alanı)	4.285
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
<b>İdari</b>	<b>18.308</b>
Edebiyat, Eğitim, İslami İlimler Fakülteleri ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü İdari Binası	9.518
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
<b>Beslenme</b>	<b>8.478</b>
Yemekhane	8.478
<b>Spor</b>	<b>12.492</b>
Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Alanı)	12.492
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>4.744</b>
Lojman	4.744
<b>Diğer</b>	<b>765</b>
Kampüs Girişi	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>69.488</b>

Kutlubey Kampüsünde, 2019 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Merkezi Derslik Binası yapım işleri sürdürülmüştür.



2019 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm



Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi ve Ormanlık ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

### 1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

**Tablo 4: 2019 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar**

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m <sup>2</sup> )	
Rektörlük Binası	11.137
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387
Kütüphane Binası	9.274
Laboratuvar Binası	12.500
Merkezi Derslik Binası	12.750
<b>Toplam Alan</b>	<b>48.048</b>



**2019 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm**

#### 1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

7167 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 18.720.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerinde ihtiyaçlar gereği 24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı Cumhurbaşkanı Oluruna müteakip 19.000.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilerek toplam ödenek 37.720.000 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 35.953.995,83 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %192, toplam ödeneğe göre %95 olarak tespit edilmiştir.

**Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu**

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Kaydı	Projeler Arası Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
<b>Kampüs Altyapısı</b>	<b>1.701.000</b>		- 1.650.000	<b>51.000</b>	<b>35.400,00</b>
<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	<b>10.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	+ 3.270.000	<b>32.270.000</b>	<b>30.732.887,75</b>
Kütüphane Binası	1.000.000			1.000.000	17.975,00
Laboratuvar Binası	2.000.000			2.000.000	1.987.839,43
Merkezi Derslik	1.500.000	19.000.000	+ 6.644.983	27.144.983	27.143.597,42
Öğrenci Yaşam Merkezi	1.500.000			1.500.000	958.459,10
Rektörlük Binası	4.000.000		- 3.374.983	625.017	625.016,80
<b>Çeşitli İşlerin Etüt Projesi</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>18.880,00</b>
<b>Muhtelif İşler</b>	<b>5.919.000</b>		- 1.681.520	<b>4.237.480</b>	<b>4.057.148,52</b>
Kesin Hesap					
Bilgi ve İletişim Tekno.	300.000		+ 138.480	438.480	350.515,88
Makine -Teçhizat	4.619.000		- 1.350.000	3.269.000	3.209.905,22
Bakım - Onarım	1.000.000		- 470.000	530.000	496.727,42
<b>Yayın Alımı</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>	<b>798.159,56</b>
<b>Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi</b>	<b>250.000</b>		+ 61.520	<b>311.520</b>	<b>311.520,00</b>
<b>KURUM TOPLAMI</b>	<b>18.720.000</b>	<b>19.000.000</b>		<b>37.720.000</b>	<b>35.953.995,83</b>

## **2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI**

### **2.1. Devam Eden Projeler**

#### **2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi**

2019 Yılı Yatırım Programı ile 1.701.000 ₺ ödenek tahsis edilen Kampüs Altyapısı Projesinden, Üst Yönetici Onayı ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Merkezi Derslik altprojesine 1.650.000,00 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır.

Yapılan aktarmalar sonrasında ödeneği 51.000 ₺ olan projeden Gölet Alanı Kazı ve Tesviye İşleri doğrudan temin ile yapılarak KDV dahil toplam 35.400,00 ₺ ödenmiştir. Projenin harcama oranı %69'tir.



**Kutlubey Kampüsü Gölet Alanı**

#### **2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

2019 yılı proje bedeli 10.000.000 ₺ olan bu projede Kütüphane Binası, Merkezi Derslik Binası, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi altprojeleri yer almaktadır.

Yoğun olarak yapım işine dayanan bu projede altproje hak edişlerinin gecikme yaşanmadan ödenebilmesi için 19.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile Kampüs Altyapısı Projesinden 1.650.000 ₺ ve Muhtelif İşler Projesinden 1.620.000 ₺ tutarında olmak üzere toplam 3.270.000 ₺ ödenek aktarılmıştır. Toplam ödeneği 32.270.000 ₺ tutarına ulaşan projeden 30.732.887,30 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



### a) Kütüphane Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Kütüphane Binası Yapım İşi için 22.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanmıştır.

Sözleşme bedeli (KDV dahil) 16.189.600 ₺ olup iş artışları ile 17.808.430,70 ₺ tutarına ulaşmıştır. 2019 yılı ödeneği 1.000.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde 17.975 ₺ olmak üzere toplam 17.039.128,68 ₺ ödeme yapılmıştır. 28.08.2019 tarihinde iş feshedilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi %96 olan bu altproje 2020 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler Projesinde Kesin Hesap altprojesine alınmıştır.



**Kütüphane Binası Yapım İşi**

### b) Rektörlük Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2017 yılı sonunda başlanan Rektörlük Binası Yapım İşinin sözleşme bedeli (KDV dahil) 18.549.600 ₺ olup iş artışları ile 19.860.317,20 ₺ tutarına ulaşmıştır.

2019 yılı ödeneği 4.000.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde aynı projede bulunan Merkezi Derslik altprojesine 3.374.983 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır. Yapılan aktarım sonrasında 625.017 ₺ tutarında ödenek kalan bu altprojeden 625.016,80 ₺ kadarı 2019 yılı içerisinde olmak üzere toplam 9.780.362,77 ₺ ödeme yapılmıştır.



**Rektörlük Binası Yapım İşi**

### c) Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşinde 02.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanmıştır.

Sözleşme bedeli (KDV dahil) 10.738.000 ₺ olup iş artışları ile 10.867.861,00 ₺ tutarına ulaşmıştır. 2019 yılı ödeneği 1.500.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde 958.459,10 ₺ olmak üzere toplam 10.597.982,97 ₺ ödeme yapılmıştır.

Fiziki gerçekleşmesi %97 olan bu altproje Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi Geçici Kabul Eksikleri yüklenici nam hesabına yaptırılması işi olarak 2020 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler Projesinde Kesin Hesap altprojesine alınmıştır.



Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi

### d) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Laboratuvar Binası Yapım İş i için 28.12.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 32.652.960,00 ₺'dir.

2019 yılı ödeneği 2.000.000 ₺ olan altprojeden yılsonuna kadar 1.987.839,43 ₺ ödeme gerçekleşmiştir.





**Laboratuvar Binası Yapım İşi**

#### **e) Merkezi Derslik Binası Yapım İşi**

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Merkezi Derslik Binası Yapım İşi için 06.12.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 44.193.360 ₺'dir.

2019 yılı ödeneği 1.500.000 ₺ olan altprojeye aynı projede yer alan Rektörlük Binası Yapım İşi altprojesinden 3.374.983 ₺, projeler arası aktarma yoluyla Kampüs Altyapısı Projesinden 1.650.000 ₺ ve Muhtelif İşler Projesinden 1.620.000 ₺ olmak üzere toplam 6.644.983 ₺ ödenek aktarılmış olup 24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 19.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

2019 yılı ödeneği 27.144.983 ₺ tutarına ulaşan altproje devam etmekte olup yılsonuna kadar 27.143.597,43 ₺ tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.



**Derslik Binası Yapım İşi**

## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. 2019 H 035 720 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2019 yılı ödeneği 50.000 ₺ olan projede Özel Eğitim Merkezi Statik Proje Çizimi ve Zemin Etüdü Yapılması İşi gerçekleştirilmiş olup sözleşme bedeli (KDV dahil) 18.800,00 ₺'dir.

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H035720			2019H035720		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	% 100			% 100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2019 - 31/12/2019			01/01/2019 - 31/12/2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		50			50	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2019		19			19	

### 2.2.2. 2019 H 033 750 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2019 mali yılında 800.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup projeden 798.159,56 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 7: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	514.612,74
Kitap Alımı	271.395,72
E-Kitap Alımı	12.151,10
<b>TOPLAM</b>	<b>798.159,56</b>

**Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2019H033750			2019H033750		
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
<b>Fiziki Hedefi</b>	100%			100%		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2019 - 31/12/2019			01/01/2019 - 31/12/2019		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		800			830	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2019		798			798	

**2.2.3. 2019 H 035 730 Muhtelif İşler Projesi**

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2019 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 300.000 ₺, makine-teçhizat alımları için 4.619.000 ₺ ve gayrimenkul bakım onarımları için 1.000.000 ₺ olmak üzere toplam 5.919.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde projeden Derslik ve Merkezi Projesine 1.620.000 ₺ ve Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 61.520 ₺ olmak üzere toplam 1.681.520 ₺ ödenek tutarında ödenek aktarılmıştır. Toplam ödeneği 4.237.480 ₺ kalan projeden 4.057.148,52 ₺ harcanmıştır.

Bu proje kapsamında 250.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, Üst Yönetici Onayı ile yıl içerisinde makine-teçhizat altprojesinden 200.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ancak daha sonra 61.520 ₺ kadarı Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 438.480 ₺ tutarına ulaşan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan harcamaları aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu**

<b>Alım Türü</b>	<b>Tutar (₺)</b>
TÜBİTAK E-İmza Ödemeleri	48.970,00
MATLAB Lisans Alımı	87.320,00
Güvenlik Duvarı Lisansı	93.456,00
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı	40.000,00
Epati Tünelleme Yazılımı Lisansı	29.945,00
Adobe Lisansı	6.290,00
İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı	16.184,88
OSKA Hakediş Yazılımı	3.245,00
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı	24.426,00
Apple Kullanıcı Lisansı	679,00
<b>TOPLAM</b>	<b>350.515,88</b>

Proje yılı ödeneği 4.619.000 ₺ olan makine – teçhizat alımlarından 200.000 ₺ aynı projede yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, 1.150.000 ₺ ise Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

Yapılan aktarımlar sonrası makine – teçhizat alımları ödeneği 3.269.000 ₺ olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü ve birim bazında aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu**

Alım Türü	Adet	Tutar (₺)
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.362	525.991,43
Büro Makineleri Alımları	106	76.747,23
Tıbbi Cihaz Alımları	23	312.710,42
Laboratuvar Cihazı Alımları	15	803.756,32
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	365	1.329.888,90
Diğer Avadanlık Alımları	8.438	160.810,92
<b>TOPLAM</b>	<b>10.309</b>	<b>3.209.905,22</b>

**Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Birim Bazında Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu**

Birim	Tutar (₺)
<b>Fakülteler</b>	<b>1.398.252,56</b>
Edebiyat Fakültesi	16.600,39
Eğitim Fakültesi	21.729,94
Fen Fakültesi	574.841,79
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.266,16
İslami İlimler Fakültesi	15.590,00
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	419.931,52
Sağlık Bilimleri Fakültesi	268.244,90
Spor Bilimleri Fakültesi	80.047,86
<b>Yüksekokullar</b>	<b>20.908,94</b>
Yabancı Diller Yüksekokulu	20.908,94
<b>Meslek Yüksekokulları</b>	<b>278.269,03</b>
Bartın Meslek Yüksekokulu	271.890,60
Ulus Meslek Yüksekokulu	6.378,43
<b>Araştırma Merkezleri</b>	<b>297.520,98</b>
Merkezi Araştırma Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi	283.228,82
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	14.292,16
<b>Koordinatörlükler</b>	<b>623,75</b>
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	623,75
<b>Rektörlük</b>	<b>1.174,69</b>
<b>Genel Sekreterlik</b>	<b>217,81</b>
<b>Daire Başkanlıkları</b>	<b>1.212.937,46</b>
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	850.789,09
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	186.018,91
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	33.812,19
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1.042,83
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	79.871,96
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	61.402,48
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.209.905,22</b>

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 470.000 ₺ tutarında ödenek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

Yapılan aktarımlar sonrası büyük bakım onarım giderleri ödeneği 530.000 ₺ olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 496.727,42 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

**Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Harcamaları Tablosu**

İşin Adı	Tutar (₺)
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO'da Bulunan Asansörlerin 2019 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Asansör Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	90.624,00
2019 Yılı İçin 11 Aylık Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	80.995,20
Mimar Sinan Dersliği Bakım Onarım İşİ ve Muhtelif İşlerin Yapılması İşİ	22.420,00
Kutlubey Kampüsü Yol Bakım Onarım İşİ	34.810,00
Basketbol Sahasında Kullanılmak Üzere Seyyar Demir Merdiven, Ağdacı Kampüsü Trafo Binası Çatısı Onarım İşİ	16.520,00
Kutlubey Kampüsü ve Ağdacı Kampüsünde Bulunan Asansörlerin MMO tarafından Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi İşİ	26.432,00
Sayısal Derslik, Sözel Derslik, Edebiyat ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İdari Binalarındaki Galeri Boşluklarına Güvenlik Ağı Yapım İşİ	23.600,00
Kutlubey Kampüsü Bakım Onarım İşİ	18.674,02
2019 Yılı Kutlubey Kampüsü Muhtelif Bakım ve Onarım İşİ	31.270,00
Ağdacı Kampüsü ve Kuruçayı Meslek Yüksek Okulunda Muhtelif Bakım ve Onarım İşİ	35.400,00
Ulus MYO Paratoner Tesisatının Yapım İşİ	8.260,00
Kutlubey Kampüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarına Tüp Muhafaza Kafesi, Muhtelif Yerlere Tel Örgü Yapılması ve Meslek Yüksek Okulu Öğrenci ve Akademisyen Tuvalet Derzlerinin Yenilenmesi İşİ	34.220,00
İktisat Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu Binalarına Otomatik Kontrol Sistemi Yapılması İşİ	33.866,00
Prefabrik Kreş Girişindeki Alçıpan Tavan ile Merkezi Araştırma Laboratuvar Binasındaki Kompresör Odası Tavan Sıvası Onarım İşİ	14.160,00
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2019 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Alınması İşİ	9.204,00
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2019 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizlerinin Yapıtırılması Hizmetinin Verilmesi	4.708,20
Kutlubey Kampüsü BESYO Yanı Sıfır Atık Depolama Alanı Yapım İşİ	11.564,00
<b>TOPLAM</b>	<b>496.727,42</b>



**Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu**


Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H035730			2019H035730		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2019 - 31/12/2019			01/01/2019 - 31/12/2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		5.919			4.237	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2019		4.057			4.057	

#### 2.2.4. 2019 H 035 750 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2019 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2019 yılı proje ödeneği 250.000 ₺ olan projeye Muhtelif İşler Projesinden 61.520 ₺ tutarında ödenek aktarılmış ve hak ediliş ödemeleri için toplam 311.520 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

**Tablo 14: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller**

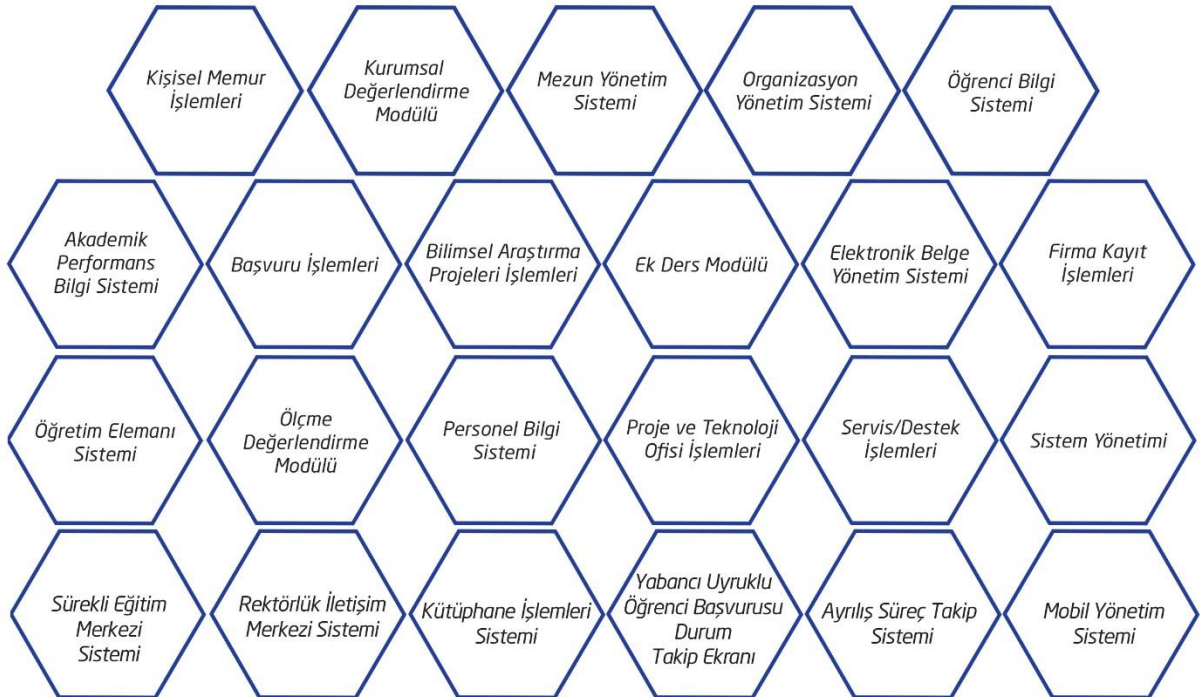

Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünün altına yeni eklenen modüller de aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ ÖSYM Önkayıt
- ✓ Enstitü Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
- ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
- ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
- ✓ Farabi Başvurusu
- ✓ Mevlana Başvurusu
- ✓ Erasmus Başvurusu
- ✓ Formasyon Başvurusu
- ✓ Özel Yetenek Sınavı Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi)
- ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu

**Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2019H035750			2019H035750		
<b>Proje Adı</b>	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
<b>Fiziki Hedefi</b>	100%			100%		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2019 - 31/12/2019			01/01/2019 - 31/12/2019		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		250			312	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2019		312			312	

### 3. 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Sektör Adı** : Eğitim

Bin TL, 2019 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2018 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H03 0440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2020	Bartın		20.573	13.872			1.701	-	1.650			35
2009H03 0450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2021	Bartın		123.049	32.395			10.000	+	22.270			30.733
2019H03 5720	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2019	Bartın		50				50					19
2019H03 3750	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2019	Bartın		800				800					798
2019H03 5730	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2019	Bartın		5.919				5.919	-	1.682			4.057
2019H03 5750	Üniversite Bilgi Sistemi	Özel Bütçe	2019	Bartın		250				250	+	62			312
<b>TOPLAM</b>						<b>150.641</b>	<b>46.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.720</b>	<b>0</b>	<b>25.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.954</b>

#### 4. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	150.641	-	-	46.267	-	-	18.720	-	-	+19.000	-	-	35.954
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>150.641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+19.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.954</b>
